

MEMORANDO

Bogotá D.C, 8 de octubre de 2025.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 07-10-2025 15:33
Al Contestar Cite Este No.: 2025IE0010467 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 70000 OFICINA DE CONTROL INTERNO
DESTINO 70000 DESPACHO DEL MINISTRO / BLANCA NURY LEGUIZAMON GALINDO
ASUNTO INFORME DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN -VASB.(SEGUNDO
OBS

2025IE0010467



PARA: HELGA MARIA RIVAS ARDILA
Ministra de Vivienda Ciudad y Territorio

Luis Roberto Cruz González
Secretario General (E)

EDWARD STEVEN LIBREROS MAMBY
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN –
VASB. (Segundo semestre 2024 y primero de 2025). SENTENCIA T –
302 DE 2017.

Cordial saludo,

De manera atenta, en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento que les compete a las oficinas de Control Interno, y acorde al Plan de auditoria 2025, se remite para los fines pertinentes el informe de seguimiento a las actividades realizadas por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en cumplimiento de las ordenes, acciones y plan de mejoramiento impartidas en el marco al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y sus Autos Derivados.

Cordialmente,

José Jorge Roca Martínez.

Jefe Oficina de Control Interno.

Anexo: Informe de seguimiento Sentencia T302 de 2017.

Elaboró: Alejandro Cano Peña – Contratista.

Revisó: José Jorge Roca Martínez.

Fecha: 7-10-2025

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

FECHA DE REALIZACION DEL INFORME DÍA	07	MES	10	AÑO	2025
---	-----------	------------	-----------	------------	-------------

PROCESO

Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico.

RESPONSABLE DEL PROCESO

Helga María Rivas Ardila. Ministra de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT.
Edward Steven Libreros Mamby. Viceministro de Agua y Saneamiento Básico - VASB.

Mónica Garzón Rodríguez. Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial- DIDE

Luis Roberto Cruz González. Secretario General (E)

TIPO DE INFORME	DE SEGUIMIENTO	X	DE LEY	
------------------------	-----------------------	----------	---------------	--

OBJETIVO

Hacer el seguimiento al plan de acción suscrito por el MVCT para dar cumplimiento a lo ordenado en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y autos derivados 696 de 2022 y 1290 de 2023, en relación con el derecho fundamental al agua para los niños de las comunidades indígenas del departamento de la Guajira.

ALCANCE

La presente evaluación se efectúa sobre el avance de la gestión realizada por el MVCT y VASB, durante el periodo comprendido entre el último semestre del año 2024 al primer semestre año 2025, para dar cumplimiento a las cuatro (4) acciones establecidas en el compromiso suscrito por el MVCT, con la Corte Constitucional, para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia T- 302 de 2017 y sus autos derivados.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

CRITERIOS

- Constitución Política de Colombia, 1991 – Artículos 209, 269, 270.
- Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 338 de 2019 por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.
- Decreto 3571 de 2011, Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- Sentencia T- 302 de 2017 (Autos 696 de 2022 y 1290 de 2023).

INTRODUCCIÓN

La Corte Constitucional mediante fallo proferido en la sentencia T 302 de 2017 declaro: "la existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayúu, ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios". En el punto cuarto del mencionado fallo se ordenó dentro de los objetivos constitucionales mínimos, aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua.

Para dar cumplimiento al Plan de Acción integrado y unificado 2023 (Autos 696 de 2022 y 1290 de 2023), se desarrolla el plan Wüin Ülees (Agua limpia), liderado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que contiene Cuatro acciones que vienen siendo desarrolladas por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico VASB, las cuales son objeto de seguimiento y los resultados serán reportados a la Contraloría General de la República, encargada de la vigilancia especial del cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

DESARROLLO

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La Oficina de Control Interno del MVCT (OCI), mediante el memorando No. 2025IE0008827 del 29 de agosto de 2025, solicitó al Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico (VASB) información sobre el avance de cada una de las cuatro (4) acciones suscritas para dar cumplimiento al Plan de Acción Integrado y Unificado 2023 (Autos 696 de 2022 y 1290 de 2023).

Dicha información fue remitida a la OCI a través del memorando No. 2025IE0009010 del 3 de septiembre de 2025, el cual contenía el enlace "[Requerimiento OCI- Seguimiento ST- 302 de 2017](#)". En este enlace se incluyó un cuadro resumen en Excel con las cuatro (4) acciones a cargo del MVCT, así como cuatro (4) carpetas con los soportes correspondientes.

Si bien las acciones se ejecutan de manera articulada con otras entidades, a partir de la información analizada se elaboró un resumen del estado actual de cada una de las cuatro (4) acciones a cargo del MVCT, correspondiente al segundo semestre de 2024 y al primer semestre de 2025:

1. Acción 1: *Mejoramiento y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua no operativos para garantizar de manera progresiva el acceso a agua potable para las comunidades wayuu de los municipios de Maicao, Uribia, Manaure y Riohacha.*

Del análisis de la información registrada en el aplicativo Sinergia V2 del Departamento Nacional de Planeación (DN), correspondiente a la meta de rehabilitaciones y mejoramientos a cargo del MVCT, se observaron las siguientes situaciones:

- No fue posible identificar con precisión la meta específica asignada al MVCT, toda vez que el sistema únicamente presenta una cifra consolidada de 822 intervenciones, compartida entre el Ministerio, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las alcaldías de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha.
- El valor total de inversión asociado al MVCT reportado en la plataforma asciende a \$150.758.000.000.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Ahora bien, al revisar los reportes trimestrales desde julio-septiembre de 2024, se identificaron las siguientes inconsistencias:

1. Diferencias entre el avance reportado y los acumulados históricos, lo que impide verificar la trazabilidad real de los proyectos de mejoramiento asignados al MVCT.
2. Solo existe información hasta el último trimestre de 2024, sin actualización para la vigencia 2025.
3. En algunos casos, los proyectos de mejoramiento son reportados como rehabilitaciones, como se evidencia en el último trimestre de 2023.
4. No se registra información sobre las rehabilitaciones que estarían a cargo del MVCT.

Respecto al avance físico agregado:

- El sistema reporta un avance del 16,55 %, equivalente a 136 de 822 intervenciones.
- No obstante, al realizar una verificación manual con base en los reportes históricos disponibles hasta el cierre de la vigencia 2024, se identificaron únicamente 96 mejoramientos, lo que representa un avance real de 11,67 % ($96/822*100$).

No obstante, según la información remitida a la Oficina de Control Interno (OCI) mediante el memorando 2025IE0009010, el archivo de Excel con el seguimiento al avance de las acciones reporta un total de 195 mejoramientos ejecutados a julio de 2025. De estos, 60 corresponden al segundo semestre de 2024, 99 al primer semestre de 2025, y el restante a otros intervalos de tiempo.

De igual forma, el consolidado de rehabilitaciones ejecutadas a julio de 2025 asciende a 39, de las cuales 4 se registran en el segundo semestre de 2024, 10 en el primer semestre de 2025, y las demás en otros periodos.

Es importante señalar que, conforme al mismo archivo de Excel, la meta asignada al MVCT para mejoramientos y rehabilitaciones es de 653 intervenciones en el periodo 2022-2026.

En cuanto a la ejecución financiera, y tomando como base la información proveniente de las dos fuentes disponibles (archivo de Excel remitido a la OCI y

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
 PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
 Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

plataforma Sinergia V2.0), se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo:

	Cuarto trimestre de 2023	Primer semestre de 2024	Segundo semestre de 2024	Primer semestre de 2025	jul-25	Total
Excel	\$ 2.169.354.940,00	\$ 1.949.311.635,00	\$ 18.197.169.950,00	\$ 29.914.352.745,00	\$ 4.574.152.000,00	\$ 56.804.341.270,00
Sinergia V2.0	\$ 5.539.254.184,00	\$ 3.160.988.017,00	\$ 38.732.363.354,00	Sin informacion	Sin informacion	\$ 47.432.605.555,00

Cuadro comparativo No. 1. Elaboración propia OCI.

Del cuadro anterior se observa que existen diferencias entre los valores reportados en cada fuente de información. Según el archivo de Excel remitido a la OCI, la ejecución financiera con corte al primer semestre de 2025 corresponde al 35 % del total de los recursos aportados por el MVCT.

Por su parte, en el aplicativo Sinergia V2.0 no fue posible determinar la ejecución financiera acumulada a dicho corte, debido a que no cuenta con reporte para el primer semestre de 2025, lo que impide establecer una comparación homogénea entre ambas fuentes.

La presente acción contempla un total de once (11) actividades, distribuidas de la siguiente manera: un (1) contrato interadministrativo, un (1) convenio de cooperación internacional, un (1) memorando de entendimiento —suscrito en asociación con Carbones del Correjón Limited—, siete (7) contratos de obra y un (1) contrato de interventoría.

En relación con el memorando de entendimiento, no fue posible obtener información que permitiera conocer su alcance o estado de ejecución, a pesar de los intentos de requerimiento realizados mediante llamadas a través de Teams el 10 y el 30 de septiembre de 2025, dirigidas a dos contratistas que participaron en la elaboración y remisión de la información inicial entregada a la OCI mediante el Memorando 2025IE0009010.

A continuación, se relacionan los cuadros de seguimiento para esta actividad:

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Contrato Interadministrativo MVCT – Findeter S.A, 1205 de 2023.

Nº Contrato/ contrato		Contrato Interadministrativo 1205 de 2023									
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio			Findeter S.A.		Tipo de proceso	Contratación directa			
Objeto del contrato		Prestación del servicio de asistencia técnica y administración de recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato									
Fecha Acta de Inicio		28 de agosto de 2023				Terminación Inicial		27 de febrero de 2025			
Plazo inicial (meses)		18	Adición de tiempo (meses)		8	Total	26	Nueva fecha de terminación		27 de octubre de 2025	
Valor inicial del contrato		COP 32.097.000.000			Valor adicional al contrato		COP 15.000.000.000		Valor total del contrato		COP 47.097.000.000
Modificaciones											
Nº	Fecha		Observaciones								
1	14 de julio de 2023		Otrosí No. 1 Aclararación valor total del Contrato.								
2	26 de diciembre de 2023		Otrosí No. 2 Modificaciones al contrato								
3	29 de diciembre de 2023		Otrosí No. 3 adición \$15.000.000.000								
4	22 de enero de 2025		Otrosí No. 4 Adición ocho (8) meses, desde el 28 de febrero hasta el 27 de octubre de 2025.								
5											
6											
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y fecha: 152523/152623 30 de may de 2023, 227823 de 28 de dic de 2023, 227927 29 dic de 2023, 227723/227823/227923 28 dic de 2023 . Recursos Presupuesto General de la Nación - PGN											
Fecha		Valor unitario desembolso			Porcentaje de Desembolso		Publicado en el Secop				
1 28 de diciembre de 2023		COP 1.880.000.000			Pago No. 1		NO				
2 21 de febrero de 2024		COP 24.528.000.000			Pago No. 2		NO				
3 26 de mayo de 2025		COP 15.377.044.698			Pago No. 3		NO				
Valor Total desembolso MVCT		COP 41.785.044.698			89%		Pendiente por desembolsar MVCT		COP 5.311.955.302		
Avance porcentual del contrato		En el componente de Infraestructura se presenta un avance de 83,50% , que corresponde a ocho (8) contratistas para atender ochenta y cuatros (84) comunidades. Los contratista y las comunidades se encuentran relacionados en el informe de supervisión con corte a 31 julio de 2025.									
Observaciones:											
1. En la revisión del SiGeVAS no arrojo ningún resultado en la búsqueda =1205-2023.											
2.En la revisión realizada a la documentación publicada en la pagina del Secop II, se encuentra incompleta, faltan soportes financieros del contrato, estudios técnicos, informes de consultorías, informes de Interventoría, presupuesto, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, informes de laboratorios, entre otros documentos, que hacen parte del contrato interadministrativo y que deberían estar contenidos en el aplicativo.											
3. Garantías: Aprobadas y actualizadas en Secop II, acorde con otrosí No. 4											
4. No fue posible validar la firma electrónica en el Secop II para las modificaciones de los contratos, en los términos del artículo 7 de la ley 527 de 1999, reglamentado por el Decreto 2364 de 2012 y demás normas aplicables. Sólo se evidencia que su estado se encuentra publicado,											
5. Por parte de la supervisión del MVCT no se evidencian soportes que permitan verificar revisiones periódicas sobre las actividades adelantadas para verificar que se cumplan las condiciones pactadas.											

Cuadro de seguimiento No.1, contrato interadministrativo No.1205. Elaboración propia OCI.

En el Convenio No. 1205 de 2023, que contempla ocho (8) contratos de obra con intervención en un total de ochenta y cuatro (84) comunidades, no se cuenta con información que permita identificar el valor invertido en cada comunidad, ni se dispone del nombre, ni del valor correspondiente a la interventoría contratada.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Convenio de Cooperación Internacional No. 1540 de 2023.

N.º Contrato/convenio		Convenio de cooperación internacional No.1540 de 2023 celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Wateraid América Inc						
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		WaterAid América INC.		Tipo de proceso	Contratación directa	
Objeto del convenio		Aunar esfuerzos técnicos y económicos entre el COOPERANTE y el MINISTERIO (MVCT) a fin de fortalecer las capacidades técnicas y sociales de las comunidades del pueblo Wayuu en La Guajira, que permitan la construcción de sostenibilidad para el acceso a agua apta para el consumo humano a través de la rehabilitación de infraestructura existente.						
Fecha Acta de Inicio		24 de agosto de 2023				Terminación Inicial	24 de febrero de 2025	
Plazo inicial (meses)		18	Adición de tiempo (meses)	9	Total	27	Nueva fecha de terminación	24 de noviembre de 2025
Valor inicial del Convenio		COP 6.136.532.910		Valor aportado al Convenio		COP 6.528.226.500	Valor total del Convenio	COP 12.664.759.410
Aportes: MVCT \$6.136.532.910 - 48% WaterAid \$6.528.226.500 - 52%								
Modificaciones								
Nº	Fecha	Observaciones						
1	Febrero de 2025	Otrosl No. 1 adición de nueve (9) meses						
2								
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y fecha: 170323- \$6.136.532.910 de 21 de junio de 2023. Recursos Presupuesto General de la Nación - PGN								
Fecha		Valor unitario desembolso		Porcentaje de Desembolso		Publicado en el Secop		
1	26 de enero de 2024	COP 1.227.306.582		20%		NO		
2	21 de febrero de 2024	COP 2.147.786.519		35%		NO		
3	22 de abril de 2024	COP 2.147.786.519		35%		NO		
Valor Total desembolso MVCT		COP 5.522.879.620		90%		Pendiente por desembolsar MVCT		COP 613.653.291
Avance porcentual del Convenio		En el componente de Infraestructura se presenta un avance de 94,80% , que corresponde a 35 intervenciones terminadas y 8 en ejecución, relacionados en el informe de supervisión con corte a 31 julio de 2025.						
Observaciones:								
1. En la revisión realizada al informe con corte al 31 de julio de 2025, se evidenció que no son ocho (8) los proyectos en ejecución si no nueve (9) proyectos, incluyendo los filtros de Bioarena.								
2. En la revisión del SiGeVAS sólo se encontró el convenio, sin evidenciar acta de inicio, soportes financieros del Convenio, oficio de delegación de la supervisión e informes de la supervisión, entre otros documentos que hacen parte del Convenio y que deberían estar publicados en el aplicativo.								
3. De igual forma que en el SiGeVAS, para el Secop II no fueron evidenciados acta de inicio, soportes financieros del Convenio, oficio de delegación de la supervisión, entre otros documentos.								
4. Interventoría: N/A								
5. No se evidenció acta de reunión o informe de comisión de la última visita realizada por el MVCT el 1 julio de 2025, según informe de Supervisión del mismo mes.								
6. Garantías: N/A								
7. De la muestra tomada a los proyectos, 32. la cachaca \$119.541.072,11, 33. el Colorado \$ 119.541.072,11, 34. el Arroyo \$ 119.541.072,11 . No se encontró información de los diagnósticos, intervenciones y otros costos directos según las actas de terminación final de infraestructura, como también presupuestos, informes de consultoría o información que permita determinar el costo para cada proyecto.								

Cuadro de seguimiento No.2, convenio de cooperación No.1540. Elaboración propia OCI.

En el Convenio de Cooperación No. 1540 de 2023, que contempla cuarenta y tres (43) intervenciones, no se encontró información que detalle el valor aportado por el MVCT para cada comunidad, ni se evidencia la razón por la cual no se incluyó una interventoría en su ejecución.

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11**

Contrato de obra No. 600 de 2024.

Nº Contrato/ contrato		Contrato de obra No. 600 de 2024							
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		Secretariado de Pastoral Social Riohacha		Tipo de proceso	Contratación directa		
Objeto del contrato		Rehabilitación y/o recuperación y/o construcción y/o reconstrucción y/o mantenimiento de infraestructura existente incluido fortalecimiento de las capacidades técnicas y sociales de las comunidades, a fin de superar el estado emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira y la extensión de sus efectos.							
Fecha Acta de Inicio		27 de febrero de 2024					Terminación Inicial	27/10/24	
Plazo inicial (meses)		8	Adición de tiempo (meses)		7	Total	15	Nueva fecha de terminación	9 de agosto de 2025
Valor inicial del contrato		COP 7.000.000.000		Valor adicional al contrato		COP 0		Valor total del contrato	COP 7.000.000.000
Aportes: MVCT 100%									
Modificaciones									
Nº	Fecha		Observaciones						
1	25 de octubre de 2024		Otrosí No. 1 adición de dos (2) meses desde el 27 de oct de 2024 hasta el 26 dic de 2024						
2	Noviembre de 2024		Acta de suspensión No.1 cuarenta y cinco (45) dias calendario, desde el 26 nov 2024 hasta 9 enero de 2025 avance del 25,18%						
3	Febrero de 2025		Otrosí No. 2 adición de dos (2) meses desde el 10 de feb de 2025 hasta el 09 abr de 2025						
4	Abril de 2025		Otrosí No. 3 adición de dos (2) meses desde el 10 de abr de 2025 hasta el 09 jun de 2025						
5	Junio de 2025		Acta de suspensión No.2 treinta (30) dias calendario, desde el 09 jun 2025 hasta 8 jul de 2025 avance del 72%						
6	9 de julio de 2025		Otrosí No. 4 adición de treinta (30) dias calendario desde el 10 de julio de 2025 hasta el 09 agosto de 2025						
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal 88124 y registro presupuestal 99024. Recursos Presupuesto General de la Nación - PGN									
Fecha		Valor unitario desembolso (Según informe de interventoría No15, junio)		Actas parciales y anticipo		Publicado en el Secop			
1	30 de abril de 2024		COP 1.400.000.000		Anticipo 20%		NO		
2	19 de septiembre de 2024		COP 116.681.065,57		Acta Parcial 2		NO		
3	16 de octubre de 2024		COP 34.256.671,67		Acta Parcial 3		NO		
4	11 de febrero de 2025		COP 26.492.953,34		Acta Parcial 4		NO		
5	12 de febrero de 2025		COP 397.121.927,73		Acta Parcial 5		NO		
6	22 de abril de 2025		COP 448.547.716,61		Acta Parcial 6		NO		
7	20 de mayo de 2025		COP 316.951.244,98		Acta Parcial 7		NO		
Valor Total desembolso MVCT		COP 2.740.051.579,90		39,14%		Pendiente por desembolsar MVCT			
Avance porcentual del contrato		En el componente de Infraestructura, se presenta un avance de 74,89%, que corresponde a 21 comunidades, relacionados en el informe de Interventoría No. 15 con corte a 30 junio de 2025.							
Observaciones:									
1.En la revisión realizada al informe con corte al 30 de junio de 2025, publicado en la pagina del Secop II, los informes evidenciados pertenecen al contratista, Secretariado del Pastoral Social Rioacha. No se evidencia ningún informe por parte de la Supervisión del MVCT.									
2. En la revisión del SiGeVAS sólo se encontró el contrato, sin evidenciar acta de inicio, soportes financieros del contrato, oficio de delegación de la supervisión e informes de la supervisión, entre otros documentos que hacen parte del contrato y que deberían estar publicados en el aplicativo.									
3. De igual forma, que en el SiGeVAS, para el Secop II no fueron evidenciados acta de inicio, soportes financieros del contrato, oficio de delegación de la supervisión, entre otros documentos.									
4. La interventoría delegada para este contrato es la No. 631 de 2024, Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S.									
5. No se evidenció acta de reunión o informe de comisión de la última inspección realizada en sitio por el MVCT .									
6. Garantías: Revisadas y avaladas por la Interventoría hasta abril de 2025 prorroga No.3 según informe No 15 con fecha 10 de julio de 2025. Se desconoce el estado actual del contrato, si se realizó alguna prorroga o adición o se encuentra en la etapa de liquidación.									
7. De la muestra seleccionada para los 32 proyectos del contrato, los soportes documentales consultados del Drive compartido para la Sentencia T302 de 2017 enviado mediante oficio con radicado 2025IE0009010 fueron: 103. Quejamana \$ 160.607.116, 102. Ceiwaka \$ 343.308.760 136. Cavina Olomana \$ 315.720.588 . No se encontró información de los diagnósticos, intervenciones y otros costos directos según las actas de terminación final de infraestructura, como también presupuestos, informes de consultoría o información que permita determinar el costo para cada proyecto.									
8. Revisando el proyecto 102. Ceiwaka aparece como cooperante Fundación Cadena Colombia y no el Secretariado de Pastoral Social Rioacha.									
9. No fue posible validar la firma electrónica en el Secop II para las modificaciones del contrato, en los términos del articulo 7 de la ley 527 de 1999, reglamentado por el Decreto 2364 de 2012 y demás normas aplicables. Sólo se evidencia que su estado se encuentra publicado.									

Cuadro de seguimiento No.3, contrato No.600. Elaboración propia OCI.

En el Contrato de Obra No. 600 de 2023, que contempla veintiún (21) intervenciones, no se encontró información que especifique el valor aportado por el MVCT a cada comunidad intervenida.

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11**

Contrato de obra No. 605 de 2024.

Nº Contrato/ contrato		Contrato de obra No. 605 de 2024							
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		VISION MUNDIAL INTERNACIONAL		Tipo de proceso	Contratación directa		
Objeto del contrato		Rehabilitación y/o recuperación y/o construcción y/o reconstrucción y/o mantenimiento de infraestructura existente incluido fortalecimiento de las capacidades técnicas y sociales de las comunidades, a fin de superar el estado emergencia económica, social y ecológica en el departamento de la guajira y la extensión de sus efectos.							
Fecha Acta de Inicio		27 de febrero de 2024				Terminación Inicial		27 de octubre de 2024	
		8	Adición de tiempo (meses)		Total	8	Nueva fecha de terminación		9 de mayo de 2025
Valor inicial del contrato		COP 6.900.000.000		Valor adicional al contrato		COP 0		Valor total del contrato	COP 6.900.000.000
Aportes: MVCT 100%									
Modificaciones									
Nº	Fecha		Observaciones						
1	27 de octubre de 2024		Otrosí No. 1 adición de dos (2) meses. desde el 27 de oct de 2024 hasta el 26 dic de 2024						
2	7 de febrero de 2025		Otrosí No. 2 adición de tres (3) meses. desde el 10 de feb de 2025 hasta el 09 may de 2025						
3	nov de 2024		Acta de suspension No.1 Cuarenta y cinco (45) días calendario, desde el 26 nov 2024 hasta 9 ene de 2025						
4									
5									
6									
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal 87324 fecha 16/1/2024 y registro presupuestal 102924. Recursos Presupuesto General de la Nación - PGN									
Fecha		Valor unitario desembolso		Actas parciales y anticipo		Publicado en el Secop			
1	Julio de 2024	COP 1.380.000.000		Anticipo		NO			
2	Agosto de 2024	COP 77.666.731,00		Parcial 1		NO			
3	Octubre de 2024	COP 52.696.938,57		Parcial 2		NO			
4	Febrero de 2025	COP 344.591.166,06		Parcial 3		NO			
5	Febrero de 2025	COP 168.495.128,84		Parcial 4		NO			
6	Abril de 2025	COP 519.403.438,89		Parcial 5		NO			
7	Mayo de 2025	COP 111.129.893,64		Parcial 6		NO			
8	Mayo de 2025	COP 1.200.592.343,00		Parcial 7		NO			
8	Junio de 2025	COP 984.380.602,00		Parcial 8		NO			
Valor Total desembolso MVCT		COP 4.838.956.242,00		70,13%		Pendiente por desembolsar MVCT		COP 2.061.043.758	
Avance porcentual del contrato		En el componente de Infraestructura, se presenta un avance de 100%, que corresponde a 20 comunidades, relacionados en el informe de Interventoría No. 15 con corte a 30 junio de 2025.							
Observaciones:									
1.En la revisión realizada al informe con corte al 31 de marzo de 2025, publicado en la pagina del Secop II, los informes evidenciados pertenecen al contratista, World Vision. No se evidencia ningún informe por parte de la Supervisión del MVCT.									
2. En la revisión del SiGeVAS sólo se encontró el contrato de obra, sin evidenciar,acta de inicio, soportes financieros del contrato, oficio de delegación de la supervisión e informes de la supervisión, entre otros documentos que hacen parte del contrato y que deberían estar publicados en el aplicativo.									
3. De igual forma que en el SiGeVAS, para el Secop II no fueron evidenciados, soportes financieros del contrato, oficio de delegación de la supervisión, entre otros documentos.									
4. La interventoría delegada para este contrato es la No. 631 de 2024, Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S.									
5. No se evidenció acta de reunión o informe de comisión de la última inspección realizada en sitio por el MVCT.									
6. Garantías: Revisadas y avaladas por la Interventoría: febrero de 2025, prorroga No.2, según informe No 15 con fecha 10 de julio de 2025. Se desconoce el estado actual del contrato, si se realizo alguna prorroga, adición o se encuentra en la etapa de liquidación.									
7. De la muestra seleccionada para los proyectos del contrato, los soportes documentales tomados del Drive compartido para la Sentencia T302 de 2017 enviado mediante oficio con radicado 2025IE0009010 fueron: 100. Tulumana \$ 205.325.370, 164. CIRUELO 1 \$ 258.302.693,43 101. Plan Bonito \$ 217.848.188 . No se encontro información de los diagnósticos, intervenciones y otros costos directos según las actas de terminación final de infraestructura, como también presupuestos, informes de consultoría o información que permita determinar el costo para cada proyecto.									
8.No fue posible validar la firma electrónica en el Secop II para las modificaciones del contrato, en los términos del articulo 7 de la ley 527 de 1999, reglamentado por el Decreto 2364 de 2012 y demás normas aplicables . Sólo se evidencia que su estado se encuentra publicado.									
9. Este contrato fue seleccionado como muestra en la auditoria que esta realizando la oficina de Control Interno al proceso Gestión a la política de Agua Potable y Saneamiento Básico.]									

Cuadro de seguimiento No.4, contrato No.605. Elaboración propia OCI.

En el Contrato de Obra No. 605 de 2024, correspondiente a veinte (20) intervenciones, si bien se cuenta con un valor global asignado para cada una de ellas, no se dispone de un desglose detallado de actividades, materiales y mano de obra que permita identificar la composición de dichos valores.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Contrato de obra No. 608 de 2024.

N.º Contrato/ contrato		Contrato de obra No. 608 de 2024							
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		Fleshman Constructores		Tipo de proceso	Contratación directa		
Objeto del contrato		Construcción de obras faltantes necesarias para garantizar el suministro de agua apta para el consumo humano con destino a la comunidad de Yotojorochi, municipio de Maicao así como en la comunidad de ayana'ajirawaa en el municipio de Uribia con el fin de superar la emergencia económica, social y ecológica en el departamento de la Guajira y la extensión de sus efectos							
Fecha Acta de Inicio		27 de febrero de 2024				Terminación Inicial		26 de mayo de 2024	
Plazo inicial (meses)		3	Adición de tiempo (meses)		Total	3	Nueva fecha de terminación		10 de julio de 2024
Valor inicial del contrato		COP 173.000.000		Valor adicional al contrato		COP 0		Valor total del contrato	COP 173.000.000
Aportes: MVCT 100%									
Modificaciones									
N.º	Fecha		Observaciones						
1	27 de octubre de 2024		Otrosl No. 1 adición de cuarenta y cinco (45) días. No se encontró el documento, información obtenida informe 30 junio de 2025						
2			Interventoría						
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal 87524 y registro presupuestal 99324. Recursos Presupuesto General de la Nación - PGN									
Fecha		Valor unitario desembolso			Actas parciales y anticipo		Publicado en el Secop		
1	12 de julio de 2024		COP 168.833.545,32			Cobro único		N/A	
2									
Valor Total desembolso MVCT		COP 168.833.545,32			97,59%		Pendiente por desembolsar MVCT		COP 0
Avance porcentual del contrato		En el componente de Infraestructura y financiero 100% que corresponde a 2 comunidades, Amuchichon, corregimiento Yotojorochi, municipio de Maicao y Ayana'ajirawaa, municipio de Uribia, relacionados en el informe de Interventoría No. 15 con corte a 30 junio de 2025.							
Observaciones:									
1. En la revisión del SiGeVAS sólo se encontró el contrato de obra, sin evidenciar acta de inicio, soportes financieros del contrato, oficio de delegación de la supervisión e informes de la supervisión, entre otros documentos que hacen parte del contrato y que deberían estar publicados en el aplicativo.									
2. No se proporciona el link de acceso al Secop del contrato.									
3. La interventoría delegada para este contrato es la No. 631 de 2024, Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S									
4. No se evidenció acta de reunión o informe de comisión de la última inspección realizada en sitio por el MVCT.									
5. Garantías: Revisadas y avaladas por el Interventoría: abril de 2025 prorroga No. 1 según informe No 15 con fecha 10 de julio de 2025. Se desconoce el estado actual del contrato, en lo que refiera a su etapa de liquidación.									

Cuadro de seguimiento No.5, contrato No.608. Elaboración propia OCI.

Para las dos (2) comunidades intervenidas —Amuchichon, en el corregimiento de Yotojorochi del municipio de Maicao y Ayana'ajirawaa, en el municipio de Uribia— correspondientes al Contrato de Obra No. 608 de 2024, no se suministró el enlace de acceso al SECOP II que permita verificar la documentación precontractual, contractual y postcontractual (estado de la liquidación).

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Contrato de obra No. 615 de 2024.

N.º Contrato/ contrato		Contrato de suministro e instalación No. 615 de 2024										
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio			Encina S.A.S		Tipo de proceso	Contratación directa				
Objeto del contrato		Construcción de las obras, suministro e instalación de equipos, puesta en marcha de los sistemas de tratamiento y distribución de agua tratada, a fin de superar el estado emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira y la extensión de sus efectos.										
Fecha Acta de Inicio		11 de marzo de 2024					Terminación Inicial		9 de diciembre de 2024			
Plazo inicial (meses)		10	Adición de tiempo (meses)		6	Total	16	Nueva fecha de terminación		10 de noviembre de 2025		
Valor inicial del contrato		COP 23.000.000.000			Valor adicional al contrato		COP 0		Valor total del contrato	COP 23.000.000.000		
Aportes: MVCT 100%												
Modificaciones												
N.º	Fecha	Observaciones										
1	9 de mayo de 2025	Otrosl No. 1 adición de seis (6) meses desde el 11 de may de 2024 hasta el 10 nov de 2024										
2	nov de 2024	Acta de suspensión No.1 un mes (1) mes calendario, desde el 13-11-2024 hasta 12-12-2024										
3	feb de 2025	Acta de suspensión No.2 tres (3) meses calendario, desde el 10-02-2025 hasta 09-05-2025										
4												
5												
6												
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal 87724 fecha 16/1/2024 y registro presupuestal 104424. Recursos Presupuesto General de la Nación - PGN												
Fecha		Valor unitario desembolso			Actas parciales y anticipo		Publicado en el Secop					
1	mayo de 2024	COP 6.900.000.000			Anticipo		NO					
2	13 de diciembre de 2024	COP 16.112.632,69			Parcial 1		NO					
3	13 de diciembre de 2024	COP 88.619.479,80			Parcial 2		NO					
4	13 de diciembre de 2024	COP 24.168.949,04			Parcial 3		NO					
5	13 de diciembre de 2024	COP 8.056.316,35			Parcial 4		NO					
6	13 de diciembre de 2024	COP 86.887.604,60			Parcial 5		NO					
8												
Valor Total desembolso MVCT		COP 7.123.844.982,48			30,97%		Pendiente por desembolsar MVCT			COP 15.876.155.018		
Avance porcentual del contrato		En el componente de Infraestructura se reporta un avance del 16,32% que corresponde a 35 comunidades, relacionados en el informe de Interventoría No. 15 con corte a 30 junio de 2025.										
Observaciones:												
1.En la revisión realizada al informe con corte a junio de 2025, publicado en la pagina del Secop II, los informes evidenciados pertenecen al contratista, Encina S.A.S. No se evidencia ningún informe por parte de la Supervisión del MVCT.												
2. En la revisión del SiGeVAS sólo se encontró copia del contrato de obra, sin evidenciar, soportes financieros del mismo, oficio de delegación de la supervisión e informes de la supervisión, entre otros documentos que hacen parte del contrato y que deberían estar publicados en el aplicativo.												
3. De igual forma que en el SiGeVAS, para el Secop II no fueron evidenciados, informes de interventoría, soportes financieros del contrato, oficio de delegación de la supervisión, entre otros documentos.												
4. La interventoría delegada para este contrato es la No. 631 de 2024, Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S.												
5. No se evidenció acta de reunión o informe de comisión de la última inspección realizada en sitio por el MVCT.												
6. Garantías revisadas y avaladas por la Interventoría, anexo 9. Acorde con prorroga No.1 según informe de Interventoría No 15, junio de 2025.												
7. De la muestra seleccionada para los proyectos del contrato, los soportes documentales tomados del Drive compartido para la Sentencia T302 de 2017 enviado mediante oficio con radicado 2025IE0009010 fueron: 10. Santana Norte \$ 354.991.395,44, 27. Wishiwou \$ 20.543.683 29. Shimolu \$38.490.708. No se encontraron información de los diagnósticos, intervenciones y otros costos directos según las actas de terminación final de infraestructura, como también presupuestos, informes de consultoría o información que permita determinar el costo para cada proyecto.												
8. Revisando el proyecto 29. Shimolu y 27. Wishiwou aparece como cooperante Cerrejón y el contratista es Encina S.A.S.												
9.No fue posible validar la firma electrónica en el Secop II para las modificaciones del contrato, en los términos del artículo 7 de la ley 527 de 1999, reglamentado por el Decreto 2364 de 2012 y demás normas aplicables. Sólo se evidencia que su estado se encuentra publicado.												
10. Los desembolsos realizados, pagos parciales, todos tienen fecha de 13 dic de 2024. De acuerdo con la información de la Interventori, se interpreta que se ha pagado el doble de lo ejecutado.												

Cuadro de seguimiento No.6, contrato No.615. Elaboración propia OCI.

En el Contrato No. 615 de 2024, correspondiente a treinta y cinco (35) comunidades beneficiadas, se registra un avance financiero pagado al contratista del 30,97 %. Sin embargo, según el Informe de Interventoría No. 15 del 30 de junio de 2025, el avance de ejecución reportado por el contratista es únicamente del 16,32 %.

Esta diferencia podría interpretarse como un pago superior al porcentaje efectivamente ejecutado.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Contrato de Interventoría No. 631 de 2024.

N.º Contrato/ contrato		Contrato de Interventoría No. 0631 de 2024							
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S.		Tipo de proceso	Contratación directa		
Objeto del contrato		Interventoría integral a los contratos de obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a atender el plan provisional y el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira y la extensión de sus efectos.							
Fecha Acta de Inicio		27 de febrero de 2024				Terminación Inicial		31 de diciembre de 2024	
Plazo inicial (meses)		10	Adición de tiempo (meses)		6	Total	16	Nueva fecha de terminación	31 de diciembre de 2025
Valor inicial del contrato		COP 6.715.000.000		Valor adicional al contrato		COP 0		Valor total del contrato	COP 6.715.000.000
Aportes: MVCT 100%									
N.º		Fecha		Modificaciones					
1		14 de febrero de 2025		Otrosí No. 1 adición de cinco (5) meses. No se encontró el documento. Información obtenida informe No.15 junio de 2025. Interventoría					
2		13 de noviembre de 2024		Acta de suspensión No.1 un mes (1) mes calendario, desde el 13-11-2024 hasta 12-12-2024 También aplicó al contrato N°615-2024.					
3		26 de noviembre de 2024		Acta de suspensión No.1 cuarenta y cinco (45) días calendario, desde el 26/11/2024 hasta 19/01/2025 También aplicó a los contratos: 600-2024, 605-2024, 632-2024, 656-2024, 706-2024					
4		10 de febrero de 2025		Acta de suspensión No.2 tres meses (3) mes calendario, desde el 10/02/2025 hasta 09/05/2025 También aplicó al contrato N°615-2024					
5		9 de junio de 2025		Acta de suspensión No.2 treinta (30) días calendario, desde el 09/06/2025 hasta 08/07/2025 También aplicó al contrato N°600- 2024					
6									
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal 94424 fecha 2024-02-06 y registro presupuestal 110324 13/02/2024. Recursos Presupuesto General de la Nación - PGN									
Fecha		Valor unitario desembolso		Actas parciales y anticipo		Publicado en el Secop			
1		9 de mayo de 2024		COP 49.618.181,82		Acta No. 1		NO	
2		9 de mayo de 2024		COP 106.236.363,64		Acta No. 2		NO	
3		5 de junio de 2024		COP 113.636.363,64		Acta No. 3		NO	
4		5 de julio de 2024		COP 113.636.363,64		Acta No. 4		NO	
5		8 de agosto de 2024		COP 113.636.363,64		Acta No. 5		NO	
6		8 de octubre de 2024		COP 128.636.363,64		Acta No. 6		NO	
7		15 de noviembre de 2024		COP 113.636.363,64		Acta No. 7		NO	
8		25 de noviembre de 2024		COP 113.636.363,64		Acta No. 8		NO	
9		14 de febrero de 2025		COP 110.008.484,85		Acta No. 9		NO	
10		14 de febrero de 2025		COP 25.090.909,09		Acta No. 10		NO	
11		17 de febrero de 2025		COP 672.279.798,97		Acta No. 11		NO	
12		20 de marzo de 2025		COP 335.107.590,91		Acta No. 12		NO	
13		22 de abril de 2025		COP 409.933.243,89		Acta No. 13		NO	
14		21 de mayo de 2025		COP 477.723.689,26		Acta No. 14		NO	
15		26 de junio de 2025		COP 145.422.867,67		Acta No. 15		NO	
Valor Total desembolso MVCT		COP 3.028.239.311,94		45,10%		Pendiente por desembolsar MVCT		COP 3.686.760.688	
Avance porcentual del Contrato		Se reporta un avance de 54,35% según informe de la misma Interventoría No 15, de fecha 30 junio de 2025.							
Observaciones:									
1. En la revisión realizada a la documentación publicada en la página del Secop II no se encuentran los informes de la Supervisión del MVCT, no se evidencia el contrato y tampoco su firma en la plataforma.									
2. En la revisión del SiGeVAS sólo se encontró el contrato y el acta de inicio, sin evidenciar, soportes financieros del contrato, oficio de delegación de la supervisión e informes de la supervisión e interventoría, entre otros documentos que hacen parte del contrato y que deberían estar publicados en el aplicativo.									
3. No se evidenció acta de reunión o informe de comisión de la última inspección realizada en sitio por el MVCT.									
4. Garantías: Aprobada por El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: marzo de 2024, prorroga No.2, según informe No 15 con fecha de junio de 2025.									
5. No se encontró otrosí del contrato.									
6. No fue posible validar la firma electrónica en el Secop II para las modificaciones del contrato, en los términos del artículo 7 de la ley 527 de 1999, reglamentado por el Decreto 2364 de 2012 y demás normas aplicables .									
9.Las suspensiones referidas a los contratos de obra, a futuro pueden versen reflejado en mayores tiempos de permanencia de la Interventoría.									
10. Este contrato fue seleccionado como muestra en la auditoria que esta realizando la Oficina de Control Interno al proceso Gestión a la política de Agua Potable y Saneamiento Básico.									

Cuadro de seguimiento No.7, contrato No.631. Elaboración propia OCI.

En el contrato 631 de 2024 no se encontró soporte que permita verificar la gestión realizada por la supervisión del MVCT frente al cumplimiento de las obligaciones establecidas para la interventoría, correspondientes a los siete (7) contratos de obra a su cargo, tal como lo exige la cláusula octava "Seguimiento y control de ejecución" del contrato de interventoría. Incluso, en el Informe No. 15 del 30 de junio de 2025, la propia interventoría reporta su avance de

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

ejecución sin evidenciar la validación o pronunciamiento por parte de la supervisión.

OCTAVA. - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN: La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR será ejercida por un **SUPERVISOR designado por el Ordenador del Gasto**, quién será responsable de efectuar el seguimiento a la correcta ejecución del contrato, aprobar los pagos, los informes que presente el INTERVENTOR, proyectar el acta de liquidación definitiva del contrato y en general cumplir con lo previsto en el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e INTERVENTOR del MVCT así como lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, así como lo indicado en los estudios previos y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso.

Contrato de obra No. 632 de 2024.

N.º Contrato/ contrato		Contrato No. 632 de 2024					
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S. E.S.P		Tipo de proceso	Contratación directa
Objeto del contrato		Rehabilitación y/o recuperación y/o construcción y/o reconstrucción y/o mantenimiento de infraestructura existente incluido fortalecimiento de las capacidades técnicas y sociales de las comunidades, a fin de superar el estado emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira y la extensión de sus efectos					
Fecha Acta de Inicio		28 de febrero de 2024			Terminación Inicial		28 de diciembre de 2024
Plazo inicial (meses)		10	Adición de tiempo (meses)	6	Total	16	Nueva fecha de terminación
Valor inicial del Contrato		COP 12.000.000.000		Valor adicional al Contrato		COP 0	Valor total del contrato
							COP 12.000.000.000
Aportes: MVCT 100%							
Modificaciones							
N.º	Fecha	Observaciones					
1	10 de febrero de 2025	Otrosl No. 1 adición de cuatro (4) meses. No se encontró otrosl publicado para verificar fechas.					
2	9 de junio de 2025	Otrosl No. 2 adición de sesenta (60) días calendario. No se encontró otrosl publicado para verificar fechas.					
3	noviembre de 2024	Acta de suspensión No.1 Cuarenta y cinco (45) días calendario, desde el 26 nov de 2024 hasta 9 ene de 2025					
4							
5							
6							
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal 88024 fecha 2024-01-16 y registro presupuestal 113324. Recursos Presupuesto General de la Nación - PGN							
Fecha		Valor unitario desembolso		Actas parciales y anticipo		Publicado en el Secop	
1	Mayo de 2024	COP 2.400.000.000		Anticipo		NO	
2	septiembre de 2024	COP 170.121.600,00		Parcial 1		NO	
3	noviembre de 2024	COP 1.297.212.339,41		Parcial 2		NO	
4	febrero de 2025	COP 1.229.034.304,08		Parcial 3		NO	
5	junio de 2025	COP 1.337.574.325,00		Parcial 4		NO	
Valor Total desembolso MVCT		COP 6.433.942.568,49		53,62%		Pendiente por desembolsar MVCT	COP 5.566.057.432
Avance porcentual del contrato		En el componente de Infraestructura se presenta un avance de 77,93% que corresponde a 32 comunidades, relacionados en el informe de Interventoría No. 15 con corte a 30 junio de 2025.					
Observaciones:							
1.En la revisión realizada a la documentación publicada en la página del Secop II, no se encuentran los informes de la Supervisión del MVCT, no se evidencia el contrato y tampoco su firma en la plataforma.							
2. En la revisión del SiGeVAS solo se encontró copia del contrato de obra.							
3.La interventoría delegada para este contrato es la No. 631 de 2024, Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S.							
4. No se evidenció acta de reunión o informe de comisión de la última inspección realizada en sitio por el MVCT.							
5. Garantías: Revisadas y avaladas por la Interventoría: junio de 2025 prorroga No.2 según informe No 15 con fecha 10 de julio de 2025. En el portal web del Secop no se encuentran publicadas las respectivas garantías. Se desconoce el estado actual del contrato, si se realizó alguna prorroga, adición o se encuentra en la etapa de liquidación.							
6.De la muestra seleccionada para los 32 proyectos del contrato, los soportes documentales tomados del Drive compartido para la Sentencia T302 de 2017 enviado mediante oficio con radicado 2025IE0009010 fueron: 139. Atunalain \$ 281.668.961,00. 140. Kashiroupa \$ 336.539.306,40. 203. Casuachon \$ 289.192.908,00. No se encontro información de los diagnósticos, intervenciones y otros costos directos según las actas de terminación final de infraestructura, como también presupuestos, informes de consultoría o información que permita determinar el costo para cada proyecto.							
7. No fue posible validar la firma electrónica en el Secop II para las modificaciones del contrato, en los términos del artículo 7 de la ley 527 de 1999, reglamentado por el Decreto 2364 de 2012 y demás normas aplicables . Sólo se evidencia que su estado se encuentra publicado.							

Cuadro de seguimiento No.8, contrato No.632. Elaboración propia OCI.

**FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11**

En el Contrato No. 632 de 2024 se reportan veintiocho (28) frentes de obra activos, correspondientes al mismo número de comunidades, de un total de treinta y dos (32) aprobadas por el MVCT. No obstante, no se dispone de una relación que detalle el valor aportado por el MVCT para cada frente de obra.

Contrato de obra No. 656 de 2024.

N.º Contrato/ contrato		Contrato de Obra No. 656 de 2024					
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		Fundación Cadena Colombia		Tipo de proceso	Contratación directa
Objeto del contrato		Rehabilitación y/o recuperación y/o construcción y/o reconstrucción y/o mantenimiento de infraestructura existente incluido fortalecimiento de las capacidades técnicas y sociales de las comunidades, a fin de superar el estado emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira y la extensión de sus efectos					
Fecha Acta de Inicio		18 de marzo de 2024				Terminación Inicial	
Plazo inicial (meses)		8	Adición de tiempo (meses)		4	Total	12
Valor inicial del Contrato		COP 7.400.000.000		Valor adicional al Contrato		COP 0	
						Valor total del Contrato	COP 7.400.000.000
Aportes: MVCT 100%							
Modificaciones							
N.º	Fecha	Observaciones					
1	18 de noviembre de 2024	Otrosí No. 1 adición de un (1) meses y diez (10) días calendario desde el 18 nov de 2024 hasta el 28 dic de 2024					
2	12 de febrero de 2025	Otrosí No. 2 adición de setenta y cinco (75) días calendario 12 de febrero de 2025 hasta 27 de abril de 2025					
3	25 de abril de 2025	Otrosí No. 3 adición de treinta y cuatro (34) días calendario 28 de abril de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025					
4	noviembre de 2024	Acta de suspensión No.1 Cuarenta y cinco (45) días calendario, desde el 26 nov de 2024 hasta 9 ene de 2025					
5							
6							
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal 87424 fecha 2024-01-16 y registro presupuestal 123724. Recursos Presupuesto General de la Nación - PGN							
Fecha		Valor unitario desembolso		Actas parciales y anticipo		Publicado en el Secop	
1	17 de mayo de 2024	COP 1.480.000.000,00		Anticipo		NO	
2	28 de enero de 2025	COP 145.643.918,81		Acta No. 1		NO	
3	26 de febrero de 2025	COP 683.220.395,19		Acta No. 2		NO	
4	19 de marzo de 2025	COP 1.480.498.702,15		Acta No. 3		NO	
5	25 de abril de 2025	COP 911.215.083,65		Acta No. 4		NO	
6	23 de mayo de 2025	COP 1.028.482.760,40		Acta No. 5		NO	
7	27 de junio de 2025	COP 393.987.486,53		Acta No. 6		NO	
Valor Total desembolso MVCT		COP 6.123.048.346,73		82,74%		Pendiente por desembolsar MVCT	
						COP 1.276.951.653	
Avance porcentual del contrato		En el componente de Infraestructura se presenta un avance de 100%, que corresponde a 18 comunidades, relacionados en el informe de Interventoría No. 15 con corte a 30 junio de 2025.					
Observaciones:							
1. En la revisión realizada a la documentación publicada en la página del Secop II no se encuentran los informes de seguimiento al contrato por parte de la Supervisión del MVCT, ni tampoco informes de la interventoría							
2. En la revisión del SiGeVAS sólo se encontró el contrato de obra, sin evidenciar, soportes financieros del contrato, oficio de delegación de la supervisión e informes de la supervisión e interventoría, entre otros documentos que hacen parte del contrato y que deberían estar publicados en el aplicativo.							
3.La interventoría delegada para este contrato es la No. 631 de 2024, Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S.							
4.No se evidenció acta de reunión o informe de comisión de la última inspección realizada en sitio por el MVCT.							
5. Garantías: Revisadas y avaladas por el Interventoría: abril de 2025 prorroga No.3 según informe No 15 con fecha 10 de julio de 2025. Acta de recibido del contrato 27/06/2025 y acta de terminación del contrato 31/05/2025. No se evidencia el estado actual de la liquidación.							
6. Para los 18 proyectos del contrato, los soportes documentales tomados del Drive compartido mediante oficio con radicado 2025IE0009010 fueron: Ishamana , Jerjet, Musamana, La Estrella, Papumana, Masuren, Wlipa, Ekimana, Walirumana, Wanapaima, Yosuiipa, Majatyupana, Limoncito, Jirrumana, La Paz, Shonkomana, Cachuyas, Pueblito Wayuu, Ouispa, La loma; no se encontró información de los diagnósticos, intervenciones y otros costos directos según las actas de terminación final de infraestructura, como también presupuestos, informes de laboratorios, informes de consultoría o información que permita determinar la trazabilidad para cada proyecto.							
7.De acuerdo con el informe de Interventoría No.15, 30 junio de 2025, la suma total de los desembolsos es \$4.643.048.346,73, valor que no coincide con la suma del valor total de lo desembolsado por el MVCT, \$ 6.123.048.346,73							
8. No fue posible validar la firma electrónica en el Secop II para las modificaciones de los contratos, en los términos del artículo 7 de la ley 527 de 1999, reglamentado por el Decreto 2364 de 2012 y demás normas aplicables . Sólo se evidencia que su estado se encuentra publicado.							

Cuadro de seguimiento No.9, contrato No.656. Elaboración propia OCI.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Para el Contrato No. 656 de 2024, con la información revisada no fue posible determinar el estado actual del proceso de liquidación ni la etapa en la que este se encuentra.

Contrato de Obra No. 706 de 2024

N.º Contrato/ contrato		Contrato de Obra No. 706 de 2024							
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		Fundación Save The Children Colombia		Tipo de proceso	Contratación directa		
Objeto del contrato		Rehabilitación y/o recuperación y/o construcción y/o reconstrucción y/o mantenimiento de infraestructura existente incluido fortalecimiento de las capacidades técnicas y sociales de las comunidades, a fin de superar el estado emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira y la extensión de sus efectos							
Fecha Acta de Inicio		29 de abril de 2024				Terminación Inicial		29 de diciembre de 2024	
Plazo inicial (meses)		8	Adición de tiempo (meses)		Total	8	Nueva fecha de terminación		11 de marzo de 2025
Valor inicial del contrato		COP 3.700.000.000		Valor adicional al contrato		COP 0		Valor total del contrato	COP 3.700.000.000
Aportes: MVCT 100%									
Modificaciones									
N.º	Fecha		Observaciones						
1	12 de febrero de 2025		Otrosí No. 1 adición de (30) días calendario desde el 12 febrero de 2025 hasta el 11 marzo de 2025						
2	nov de 2024		Acta de suspensión No.1 Cuarenta y cinco (45) días calendario, desde el 26 nov de 2024 hasta 9 ene de 2025						
3									
4									
5									
6									
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal 94624 fecha 2024-02-07 y registro presupuestal 102924. Recursos Presupuesto General de la Nación - PGN									
Fecha		Valor unitario desembolso		Actas parciales y anticipo		Publicado en el Secop			
1	julio de 2024	COP 740.000.000,00		Acta No. 1		NO			
2	26 feb de 2025	COP 15.731.496,00		Acta No. 2		NO			
3	26 feb de 2025	COP 15.731.496,00		Acta No. 3		NO			
4	14 mar de 2025	COP 70.529.184,00		Acta No. 4		NO			
5	21 mar de 2025	COP 351.449.441,53		Acta No. 5		NO			
6	21 mar de 2025	COP 204.869.377,00		Acta No. 6		NO			
7	21 abr de 2025	COP 1.054.754.889,45		Acta No. 7		NO			
8	21 abr de 2025	COP 355.767.757,93		Acta No. 8		NO			
9	13 may de 2025	COP 616.731.294,79		Acta No. 9					
Valor Total desembolso MVCT		COP 3.425.564.936,70		92,58%		Pendiente por desembolsar MVCT		COP 274.435.063	
Avance porcentual del contrato		En el componente de Infraestructura se presenta un avance de 100%, que corresponde a 10 comunidades, relacionados en el informe de Interventoría No. 15 con corte a 30 junio de 2025.							
Observaciones:									
1. En la revisión realizada a la documentación publicada en la página del Secop II, no se encuentran los informes de seguimiento al contrato por parte de la Supervisión del MVCT e interventoría, soportes financieros del contrato, oficio de delegación de la supervisión, entre otros documentos.									
2. En la revisión del SiGeVAS no arrojo ningún resultado en la búsqueda =706-2024.									
3. La interventoría delegada para este contrato es la No. 631 de 2024, Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S.									
4. No se evidenció acta de reunión o informe de comisión de la última inspección realizada en sitio por el MVCT.									
5. Garantías: Revisadas y avaladas por Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio: Febrero de 2025 prorroga No.1, según informe No 15 con fecha 10 de julio de 2025. No se evidencia el estado actual de la liquidación.									
6. Para 8 de los 10 proyectos seleccionados, como muestra del contrato, los soportes documentales tomados del Drive compartido mediante oficio con radicado 2025IE0009010 fueron: Torrinchi, La Arenosa, Betania 1, Jatsamana, Cucurumana, Mañature, Jotojorol, Kajuchonkal. No se encontró información de los diagnósticos, intervenciones y otros costos directos según las actas de terminación final de infraestructura, como también presupuestos, informes de laboratorios, informes de consultoría o información que permita determinar la trazabilidad para cada proyecto.									
7. No fue posible validar la firma electrónica en el Secop II para las modificaciones del contrato, en los términos del artículo 7 de la ley 527 de 1999, reglamentado por el Decreto 2364 de 2012 y demás normas aplicables. Sólo se evidencia que su estado se encuentra publicado.									

Cuadro de seguimiento No.10, contrato No.706. Elaboración propia OCI.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Respecto al Contrato No. 706 de 2024, con la información revisada no fue posible determinar el estado actual del proceso de liquidación ni la etapa en la que este se encuentra.

Es preciso aclarar que la información relacionada con los siguientes contratos:

1. Veolia Aguas de La Guajira S.A.S. E.S.P. – Contrato No. 632-2024
2. World Vision Colombia – Contrato No. 605-2024
3. Fundación Cadena Colombia – Contrato No. 656-2024
4. Secretariado de Pastoral Social de Riohacha – Contrato No. 600-2024
5. Edwin Fleshman – Contrato No. 608-2024
6. Encina S.A.S. – Contrato No. 615-2024
7. Fundación Save the Children – Contrato No. 706-2024

Fue extraída del Informe de Interventoría No. 15 de junio de 2025, el cual se encuentra anexado al Otrosí No. 4 del Contrato de Obra No. 600-2024, suscrito con el Secretariado de Pastoral Social de Riohacha.

Finalmente, dentro de la Acción No. 1 se identificó una actividad denominada **“Memorando de Entendimiento”**, cuyo objeto *es articular y coordinar esfuerzos, políticas, iniciativas y acciones encaminadas a brindar soluciones de agua segura en el departamento de La Guajira, dentro de las competencias y obligaciones legales de cada una de las partes, con el fin de implementar el Plan Wüin Ülees (Agua Limpia).*

Esta actividad se desarrolla en conjunto con **Carbones del Cerrejón Limited**, con fecha de inicio **29/09/2023** y fecha de finalización **29/09/2026**.

No obstante, no se cuenta con información que permita establecer el alcance, avances o tipo de gestión asociada a dicha actividad, por lo cual no fue posible elaborar el cuadro de seguimiento correspondiente.

Para la Acción No. 1, con base en la información consolidada en los cuadros de seguimiento, se identificó que el valor desembolsado por el MVCT asciende a **\$81.190.405.831,56**.

2. Acción No. 5. Construcción de 11 Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable bajo el esquema de Pilas Públicas que incluyen Centros de Producción y Puntos Aferentes en las comunidades de Riritana (municipio de Maicao) Sichichon, La Gloria, Panchomana (municipio de

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Manaure) Siapana, Flor de La Guajira, Puerto Estrella, Punta Espada, Bahía Hondita, Zona Industrial (Municipio de Uribia) y Romonero (distrito de Riohacha).

La Acción No. 5 cuenta con seis (6) Convenios de Uso de Recursos – CUR.

Del análisis de la información registrada en el aplicativo Sinergia V2 del DNP, correspondiente a la meta de comunidades beneficiadas a partir de la construcción de 11 proyectos de abastecimiento de Agua Potable bajo el esquema de Pilas Publicas a cargo del MVCT, se observaron las siguientes situaciones:

- La meta específica asignada por el MVCT, para el periodo comprendido entre 2022 hasta 2026 fue de 1039 comunidades beneficiadas con el acceso de agua potable.
- El valor total de inversión asociado al MVCT reportado en la plataforma asciende a \$85.570.513.531.

Ahora bien, al revisar los reportes trimestrales desde abril-junio de 2024, se identificaron las siguientes inconsistencias:

1. Diferencias entre los avances trimestrales registrados, y los avances trimestrales reportados, lo que ocasiona confusiones para la trazabilidad real de las comunidades beneficiadas.
2. Solo existe información hasta el último trimestre de 2024, sin actualización para la vigencia 2025.

Respecto al avance físico indicado:

- El sistema reporta un avance de 103,27 %, equivalente a 1073 de 1039 comunidades beneficiadas.
- Las comunidades beneficiadas por municipio y pilas públicas durante 2023 y 2024 fueron: Uribia - Pila Pública Zona Industrial -338 comunidades; Flor de La Guajira – 99 comunidades; Siapa -64 comunidades; Puerto Estrella – 100 comunidades. Riohacha- Romonero- 75 comunidades. Maicao -Rirritana-83 comunidades. Manaure-La Gloria-120 comunidades; Panchomana- 115 comunidades; Sichichon-79 comunidades.

En relación con la ejecución financiera, se identificó que no es posible consolidar un cuadro comparativo entre las dos fuentes disponibles (archivo en

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Excel remitido a la OCI y plataforma Sinergia V2.0), debido a que presentan la información con estructuras y cortes diferentes.

Por un lado, Sinergia V2.0 reporta la ejecución por trimestres con corte al 31/12/2024, registrando una ejecución acumulada de \$83.067.399.133, que incluye recursos de Presupuesto General de la Nación (PGN) por \$58.490.761.025 y Sistema General de Participaciones (SGP) por \$24.576.638.108, lo que representa el 97% del presupuesto asignado para esta acción.

Por otro lado, el archivo en Excel presenta la ejecución desagregada por proyectos, sin especificar la fecha de corte. En dicha fuente, se reporta la ejecución de 10 de los 11 proyectos (sin incluir el correspondiente a la comunidad de Romonero), con un total ejecutado de \$48.679.286.909 con cargo a recursos PGN, sin que se precise el periodo al cual corresponde dicha ejecución.

De acuerdo con la información consignada en el cuadro en Excel remitido a la OCI mediante el Memorando **2025IE0009010**, la presente acción comprende un total de **seis (6) convenios interadministrativos**, distribuidos de la siguiente manera:

- **Convenio 132 de 2008**, que beneficia a las comunidades Flor de la Guajira, Punta Espada y Puerto Estrella en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Riritana en el municipio de Maicao.
- **Convenio 1130 de 2020**, para la comunidad Zona Industrial, municipio de Uribia.
- **Convenio 1131 de 2020**, para la comunidad La Gloria, municipio de Manaure.
- **Convenio 1132 de 2020**, para la comunidad Sichichon, municipio de Manaure.
- **Convenio 1126 de 2021**, para la comunidad Panchomana, municipio de Manaure.
- **Convenio 1143 de 2021**, para las comunidades Bahía Hondita y Siapana, municipio de Uribia.

Se resalta que **no se cuenta con información del convenio correspondiente a la comunidad de Romonero** (distrito de Riohacha), por lo cual no fue posible incluirlo en esta relación, al no estar incluido dentro del apoyo financiero de la Nación, PGN, a través del MVCT.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

A continuación, se relacionan los cuadros de seguimiento para esta actividad:

Convenio interadministrativo No. 132 de 2008

N.º Contrato/convenio		Convenio interadministrativo de usos de recursos - CUR 132 de 2008					
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		Gobernación de la Guajira		Tipo de proceso	CUR
Objeto del contrato		Establecer los términos y condiciones para el uso de recursos aportados por las entidades firmantes del presente convenio destinados a la implementación y ejecución del PDA, definir los compromisos de avance del PDA y determinar la forma como se hará el seguimiento a dichos compromisos; lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 21 del Decreto 3200 de 2008. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTES, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS, COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE FLOR DE LA GUAJIRA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA					
Fecha Acta de Inicio		30 de diciembre de 2008				Terminación Inicial	12 de diciembre de 2022
Plazo inicial (meses)		24	Adición de tiempo (meses)		Total	24	Nueva fecha de terminación
Aportes MVCT		COP 25.739.675.999		Valor adicional al Convenio		COP 0	Valor total del Convenio
						COP 25.739.675.999	
Modificaciones							
N.º	Fecha	Observaciones					
1	4 de septiembre de 2023	Resolución 0804 Municipio de Maicao, comunidad Riritana obra- suministro fortalecimiento, puesta en marcha e Interventoría adición \$877.803.714; Seguimiento MVCT \$17.556.074 total \$895.359.788					
2	4 de septiembre de 2023	Resolución 0804 Municipio de Uribia, comunidad Flor de la Guajira obra- suministro fortalecimiento, puesta en marcha e Interventoría adición \$470.591.241; Seguimiento MVCT \$9.411.825 total \$480.003.006					
3	4 de septiembre de 2023	Resolución 0804 Municipio de Uribia, comunidad Puerto Estrella obra- suministro fortalecimiento, puesta en marcha e Interventoría adición \$1.504.701.310; Seguimiento MVCT \$30.094.026 total \$1.534.795.336					
4	29 de noviembre de 2024	Resolución de asignación de recursos 0802,. Municipio Uribia-Comunidades Punta Espada, Karasua, Samutpana y Guarerpa. Adición \$7.719.847.809					
5							
6							
Números de Certificados Disponibilidad Presupuestal resolución de asignación de recursos 0921 de 2019: 160319, \$18.500.000.000. Resolución de asignación de recursos 0036 de 2021:\$18.500.000.0000 (Modifica resolución 0921 de 2019, quita un proyecto comunidad Amaripa, municipio de Maicao y adiciona comunidad de Puerto Estrella, municipio de Uribia). Resolución de asignación de recursos 0804 de 2023: 109019,109119,109219,154923-\$877.803.714, 155023-\$17.556.074, 148723-\$470.591.241,148823-\$9.411.825,148123-\$1.504.701.310,148323- \$30.094.026. Resolución de asignación de recursos 0802 de 2024, 146624, 146524.							
Fecha		Valor unitario desembolso		Desembolsos		Publicado en el Secop	
1	dic de 2021	COP 4.576.996.700,00		Desembolso 1 Rirritana		NO	
2	21 de febrero de 2024	COP 877.803.714,00		Desembolso 2 Rirritana		NO	
3	dic de 2021	COP 5.124.952.514,00		Desembolso 1 Punta Espada		NO	
4	Fecha desconocida	COP 3.430.038.496,00		Desembolso 1 Puerto estrella		NO	
5	Fecha desconocida	COP 1.504.701.310,00		Desembolso 2 Puerto Estrella		NO	
6	Fecha desconocida	COP 5.005.267.192,00		Desembolso 1 Flor de la Guajira		NO	
7	Fecha desconocida	COP 470.591.241,00		Desembolso 2 Flor de la Guajita		NO	
8							
Valor Total desembolso MVCT		COP 20.990.351.167,00		81,55%		Valores recursos no ejecutados	COP 4.749.324.832
Avance porcentual del Convenio		En el componente de Infraestructura presenta un avance aproximado de 99%, para Flor de la Guajira \$5.585.375.602 , 93,7% para Puerto Estrella \$6.870.556.166, 71,63% para Punta Espada \$ 7.719.847.809,71, 100% para Riritana \$5.563.896.422 que corresponde a comunidades, relacionados en el informe supervision con corte a 31 julio de 2025.					
Observaciones:							
1. En la revisión realizada a la documentación publicada en la página del Secop I se encuentra incompleta evidenciando sólo el convenio y el otrosí No. 1. No hay informes de Supervisión del MVCT y del Municipio, soportes financieros del Convenio, oficio de delegación de la supervisión, entre otros documentos.							
2. En la revisión del SIGeVAS no se encontraron actas del perfeccionamiento del convenio, estudios técnicos, informes de consultorías, informes de Interventoría, soporte de pagos, presupuesto, especificaciones, informes de laboratorios, entre otros documentos que hacen parte del Convenio y que deberían estar publicados en el aplicativo.							
3. No se evidencia informes de Interventoría a los contratos de obra derivados del convenio.							
4. No se encontró información de los diagnósticos, intervenciones y otros costos directos , como también presupuestos, informes de consultoría o información que permita determinar el costo para cada proyecto.							
5. La información del convenio no tiene una trazabilidad completa desde el momento de su suscripción, Ministerio de Ambiente, 2008.							

Cuadro de seguimiento No.11, convenio No.132 de 2008. Elaboración propia OCI.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Para los proyectos correspondientes a las comunidades, Flor de la Guajira, Punta Espada, Puerto Estrella y Riritana, incluidas en el Convenio 132 de 2008, se observa que, de acuerdo con los informes de supervisión individuales, con corte a julio de 2025, la vigencia de ejecución del convenio fue programada inicialmente para un plazo entre 18 y 19 meses, con inicio en octubre de 2021. No obstante, la fecha de terminación real actualmente proyectada es noviembre de 2025, lo cual representa un retraso superior a dos (2) años frente al cronograma originalmente establecido.

Adicionalmente, no fue posible establecer una trazabilidad completa del convenio desde su suscripción en 2008 hasta junio de 2025, en tanto la documentación disponible únicamente evidencia el Otrosí No. 1 del 18 de diciembre de 2023, mediante el cual se modifica la cláusula quinta, sin que se cuente con registros intermedios que permitan conocer la evolución contractual durante dicho periodo.

Convenio interadministrativo No. 1130 de 2020

Nº Contrato/convenio		Convenio interadministrativo MVCT-1130-2020							
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		ESEPGUA S.A.E.S.P - Municipio Uribia		Tipo de proceso	CUR		
Objeto del contrato		Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y APUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE GUA MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PUBLICAS, EN EL SECTOR DE LA GUAJIRA ZONA INDUSTRIAL-MUNICIPIO DE URIBIA", y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Uribia, Departamento de La Guajira.							
Fecha Acta de Inicio		15 de enero de 2021				Terminación Inicial	15 de agosto de 2022		
Plazo inicial (meses)		19	Adición de tiempo (meses)	37	Total	56	Nueva fecha de terminación	31 de octubre de 2025	
Aportes MVCT		COP 11.282.656.398		Recursos SGP del departamento		COP 5.056.652.728		Valor total del Convenio	COP 16.339.309.126
Modificaciones									
Nº		Fecha		Observaciones					
1		15 de agosto de 2022		Otrosí No. 1 Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta 31 dic de 2023.					
2		28 de diciembre de 2023		Otrosí No. 2 Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta 31 dic de 2024.					
3		30 de diciembre de 2024		Otrosí No. 3 Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta 31 oct de 2025.					
4									
5									
6									
Resolución de Asignación de Recursos No. 0795 de 2020. No. Certificado Disponibilidad Presupuestal 120320-\$980.392, 120420-\$19608(2020), \$88.235.294(2021), \$132973655(2022). CDP's 77721,415220, Vigencia Futura Oficio Min hacienda No. 2- 2020-054384 \$ 4.411.764.706(2021), \$6.648.682.743(2020)									
Fecha		Valor unitario desembolso		Orden de pago/bancaria		Publicado en el Secop			
1		20 de diciembre de 2021		COP 980.392,00		Pago 1		NO	
2		30 de diciembre de 2021		COP 4.411.764.706,00		Pago 2		NO	
3		22 de julio de 2025		COP 6.648.682.743,00		Pago 3		NO	
4								NO	
Valor Total desembolso MVCT		COP 11.061.427.841,00		98,04%		Valores recursos no ejecutados			
Avance porcentual del Convenio		En el componente de Infraestructura se presenta un avance de 75,83% que corresponde a una comunidad, relacionados en el informe de supervisión con corte a 31 julio de 2025.							
Observaciones:									
1. En la revisión realizada a la documentación publicada en la pagina del Secop I se encuentra incompleta evidenciando sólo el convenio y los otrosíes. No hay informes de Supervisión del MVCT y del Municipio, oficio de delegación de la supervisión, entre otros documentos relevantes.									
2. En la revisión del SiGeVAS no se encontraron actas de inicio del convenio, estudios técnicos, informes de consultorías, informes de Interventoría, soporte de pagos, presupuesto, especificaciones, informes de laboratorios, entre otros documentos que hacen parte del Convenio y que deberían estar publicados en el aplicativo.									
3. No se evidencia informes de Interventoría a los contratos de obra derivados del convenio.									
4. No se encontró información de los diagnósticos, intervenciones y otros costos directos , como también presupuestos, informes de consultoría o información que permita determinar el costo para cada proyecto.									
5. La información suministrada en el cuadro de excel, requerimiento OCI seguimiento sentencia T-302 de 2017, enviada mediante oficio con radicado 2025IE0009010 no coincide con los soportes revisados, puntualmente con el valor del convenio, su fecha de inicio y su finalización.									
6. Es importante aclarar que según informe de supervisión con fecha 31 julio de 2025, de los \$ 11,282,656,398.00 desembolsados por el MVCT, solo se ha pagado \$ 3,872,577,271.21.									

Cuadro de seguimiento No.12, convenio No.1130. Elaboración propia OCI.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Para el proyecto correspondiente a la comunidad Zona Industrial, Convenio 1130 de 2020, se observa que, de acuerdo con el informe de supervisión, con corte a julio de 2025, la vigencia de ejecución del convenio fue programada inicialmente para un plazo de 19 meses, con inicio el 15 enero de 2021. No obstante, la fecha de terminación real actualmente proyectada es 31 octubre de 2025, lo cual representa un retraso superior a tres (3) años frente al cronograma originalmente establecido.

Convenio interadministrativo No. 1131 de 2020

N.º Contrato/convenio		Convenio interadministrativo MVCT-1131-2020								
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio			Municipio de Manaure Departamento de La Guajir			Tipo de proceso	CUR	
Objeto del contrato		Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTES, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS, COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LA GLORIA, MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA ", y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Manaure, Departamento de La Guajira.								
Fecha Acta de Inicio		15 de enero de 2021					Terminación Inicial		16 de agosto de 2022	
Plazo inicial (meses)		19	Adición de tiempo (meses)		27	Total	46	Nueva fecha de terminación		28 de febrero de 2026
Aportes MVCT		COP 4.551.826.391			Valor reformulación			COP 1.779.228.448	Valor total del Convenio	COP 6.331.054.839
Modificaciones										
N.º	Fecha		Observaciones							
1	16 de agosto de 2022		Otro sí No. 1 Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta 30 nov de 2023							
2	30 de noviembre de 2023		Otro sí No. 2 Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta 31 dic de 2024							
3	30 de diciembre de 2024		Otro sí No. 3 Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta 31 ago de 2025							
4	29 de agosto de 2025		Otro sí No. 4 Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta 28 feb de 2026							
5										
6										
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal 173023-\$35.895.245, 120320, 78221, 172923, . No se evidencio Resolución de Asignación de Recursos.										
Fecha		Valor unitario desembolso			Orden de pago/bancaria		Publicado en el Secop			
1	22 de diciembre de 2021		COP 980.392,00			Pago 1		NO		
2	30 de diciembre de 2021		COP 1.745.000.000,00			Pago 2		NO		
3	26 de octubre de 2022		COP 670.500.000,00			Pago 3		NO		
4	22 de diciembre de 2022		COP 665.026.835,00			Pago 4		NO		
5	22 de diciembre de 2022		COP 1.744.341.616,00			Pago 5		NO		
6								NO		
Valor Total desembolso MVCT		COP 4.825.848.843,00			76,23%		Valores recursos no ejecutados			COP 1.505.205.996
Avance porcentual del Convenio		En el componente de Infraestructura se presenta un avance de 99,9% que corresponde a una comunidad, relacionados en el informe de supervisión con corte a 31 julio de 2025.								
Observaciones:										
1. En la revisión realizada a la documentación publicada en la pagina del Secop I se encuentra incompleta evidenciando sólo el convenio, memorando y los otrosíes. No hay informes de Supervisión del MVCT y del Municipio, oficio de delegación de la supervisión, entre otros documentos relevantes.										
2. En la revisión del SiGeVAS no se encontraron, estudios técnicos, informes de consultorías, informes de Interventoría, soporte de pagos, presupuesto, especificaciones, informes de laboratorios, entre otros documentos que hacen parte del Convenio y que deberían estar publicados en el aplicativo.										
3. No se evidencia informes de Interventoría a los contratos de obra derivados del convenio.										
4. No se encontró información de los diagnósticos, intervenciones y otros costos directos, como también presupuestos, informes de consultoría o información que permita determinar el costo para cada proyecto.										
5. La información suministrada en el cuadro de excel, requerimiento OCI seguimiento sentencia T-302 de 2017, enviada mediante oficio con radicado 2025IE0009010 no coincide con los soportes revisados, puntualmente con el valor del convenio, su fecha de inicio y su finalización.										
6.Es importante aclarar que según informe de supervisión con fecha 30 julio de 2025, de los \$4,825,848,843.00 desembolsados por el MVCT, solo se ha pagado \$3,241,992,111.55.										

Cuadro de seguimiento No.13, convenio No.1131. Elaboración propia OCI

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Convenio interadministrativo No. 1132 de 2020

Nº Contrato/convenio		Convenio interadministrativo MVCT-1132-2020							
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		Municipio de Manaure Departamento de La Guajira		Tipo de proceso	CUR		
Objeto del contrato		Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PUNTO DE PRODUCCIÓN, SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA, CONSTRUCCIÓN PILAS AFERENTES, SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA PILAS, COMPONENTE SOCIAL Y ASEGURAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SICHICHON, MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA ", y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Manaure, Departamento de La Guajira.							
Fecha Acta de Inicio		16 de enero de 2021				Terminación Inicial		16 de agosto de 2022	
Plazo Inicial (meses)		19	Adición de tiempo (meses)	31,5	Total	50,5	Nueva fecha de terminación		28 de febrero de 2026
Aportes MVCT		COP 3.827.307.553		Valor reformulaciones		COP 941.534.696		Valor total del Convenio	COP 6.484.162.160
Aportes SGP Departamento		COP 1.715.319.911							
Modificaciones									
Nº	Fecha	Observaciones							
1	16 de agosto de 2022	Otrosl No. 1 Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta 30 nov de 2023							
2	30 de noviembre de 2023	Otrosl No. 2 Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta 31 dic de 2024							
3	31 de diciembre de 2024	Otrosl No. 3 Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta 31 ago de 2025							
4	29 de septiembre de 2025	Otrosl No. 4 Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta 28 feb de 2026							
5									
6									
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal 120320-\$3. 751.281.915, 78321-\$923.073.231, 155223-\$18.461.465, 155123-\$923.073.231, 155123-\$1.715.319.911									
Fecha		Valor unitario desembolso		Orden de pago/bancaria		Publicado en el Secop			
1	22 de diciembre de 2021	COP 980.392,00		Pago 1		NO			
2	30 de diciembre de 2021	COP 2.135.000.000,00		Pago 2		NO			
3	26 de octubre de 2022	COP 810.500.000,00		Pago 3		NO			
4	22 de diciembre de 2022	COP 805.781.915,00		Pago 4		NO			
5	19 de marzo de 2024	COP 923.073.231,00		Pago 5		NO			
6									
7									
Valor Total desembolso MVCT		COP 4.675.335.538,00		72,10%		Valores recursos no ejecutados		COP 1.808.826.622	
Avance porcentual del Convenio		En el componente de Infraestructura se presenta un avance de 99,80% que corresponde a una comunidad, relacionados en el informe de supervisión con corte a 31 julio de 2025.							
Observaciones:									
1. En la revisión realizada a la documentación publicada en la pagina del Secop I se encuentra incompleta evidenciando sólo el convenio, memorando y los otrosíes. No hay informes de Supervisión del MVCT y del Municipio, oficio de delegación de la supervisión, entre otros documentos relevantes.									
2. En la revisión del SiGeVAS no se encontraron, estudios técnicos, informes de consultorías, informes de Interventoría, soporte de pagos, presupuesto, especificaciones, informes de laboratorios, entre otros documentos que hacen parte del Convenio y que deberían estar publicados en el aplicativo.									
3. No se evidenciaron informes de Interventoría a los contratos de obra derivados del convenio.									
4. No se encontró información de los diagnósticos, intervenciones y otros costos directos , como también presupuestos, informes de consultoría o información que permita determinar el costo para cada proyecto.									
5. La información suministrada en el cuadro de excel, requerimiento OCI seguimiento sentencia T-302 de 2017, enviada mediante oficio con radicado 2025IE0009010 no coincide con los soportes revisados, puntualmente con el valor del convenio, su fecha de inicio y su finalización.									
6. Es importante aclarar que según informe de supervisión con fecha 30 julio de 2025, de los \$4,675,335,538.00 desembolsados por el MVCT, solo se ha pagado \$ 3,538,208,777.46									
7. No se evidenció acta de reunión o informe de comisión de la última inspección realizada en sitio por el MVCT.									
8. Revisado el informe de supervisión con fecha 30 de julio de 2025 el CDP No. 155223-\$17.556.074 en la resolución 0640 de 2023 el mismo CDP No.155223-\$18.461.465 sin corresponder los valores.									

Cuadro de seguimiento No.14, convenio No.1132. Elaboración propia OCI

Para los proyectos correspondientes a las comunidades La Gloria (Convenio 1131 de 2020) y Sichichon (Convenio 1132 de 2020), se evidencia que, según los informes de supervisión con corte a julio de 2025, la vigencia de ejecución de los convenios fue programada inicialmente para un plazo de 19 meses, con fecha de inicio el 15 y 16 de enero de 2021, respectivamente.

Sin embargo, la fecha de terminación real actualmente proyectada para ambos convenios es el 26 de febrero de 2026, de acuerdo con lo establecido en los Otrosíes No. 4 del 29 de agosto de 2025, lo cual representa un retraso superior a tres (3) años frente al cronograma originalmente definido.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Convenio interadministrativo No. 1126 de 2020.

Nº Contrato/convenio		Convenio interadministrativo MVCT-1126-2021					
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		Municipio de Manaure Departamento de La Guajira		Tipo de proceso	CUR
Objeto del contrato		Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD DE PANCHOMANA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA ", y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Manaure, Departamento de La Guajira					
Fecha Acta de Inicio		12 de noviembre de 2021				Terminación Inicial	
Plazo inicial (meses)		18	Adición de tiempo (meses)		36	Total	54
Aportes Nacion PGN 2021		COP 8.510.721.622		Aportes Nación PGN 2023		COP 1.478.397.665	Valor total del Convenio
COP 9.989.119.287							
Aportes: MVCT 100%							
Modificaciones							
Nº	Fecha	Observaciones					
1	9 de mayo de 2023	Otroso No. 1 Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta 11 may de 2024					
2	10 de mayo de 2024	Otroso No. 2 Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta 11 may de 2025					
3	9 de mayo de 2025	Otroso No. 3 Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta 11 may de 2026					
4							
5							
6							
Resolución de Asignación de Recursos No. 0644 de 2023 No. Certificado Disponibilidad Presupuestal 167923-\$1.449.409.475, 167723-\$28.988.190, 154321-\$1.449.409.475							
Fecha		Valor unitario desembolso		Orden de pago/bancaria		Publicado en el Secop	
1	26 de octubre de 2022	COP 2.505.500.000,00		Pago No. 1 Vigencia 2021		NO	
2	22 de diciembre de 2022	COP 5.838.344.727,00		Pago No. 2 Vigencia 2021		NO	
3	dic de 2024	COP 1.449.409.475,00		Pago No. 3 Vigencia 2021		NO	
4							
Valor Total desembolso MVCT		COP 9.793.254.202,00		98,04%		Valores recursos no ejecutados	
						COP 195.865.085	
Avance porcentual del Convenio		En el componente de Infraestructura se presenta un avance de 99% que corresponde a una comunidad, relacionados en el informe de supervisión con corte a 31 julio de 2025.					
Observaciones:							
1. No fue posible verificar la información publicada en la pagina del Secop I, el link suministrado en el cuadro de excel, requerimiento OCI seguimiento sentencia T-302 de 2017 corresponde al contrato MVCT-1085-2020. Ver soporte No. 1.							
2. En la revisión del SiGeVAS no se encontraron, estudios técnicos, informes de consultorías, informes de Interventoría, resolución de asignación de recursos, soporte de pagos, presupuesto, especificaciones, informes de laboratorios, entre otros documentos que hacen parte del Convenio y que deberían estar publicados en el aplicativo. Ver soporte No. 2							
3. No se evidencia informes de Interventoría a los contratos de obra derivados del convenio.							
4. No se encontró información de los diagnósticos, intervenciones y otros costos directos , como también presupuestos, informes de consultoría o información que permita determinar el costo para cada proyecto.							
5. La información suministrada en el cuadro de excel, requerimiento OCI seguimiento sentencia T-302 de 2017, enviada mediante oficio con radicado 2025IE0009010 no coincide con los soportes revisados, puntualmente con el valor del convenio, su fecha de inicio y su finalización.							
6. Es importante aclarar que según informe de supervisión con fecha 31 julio de 2025, de los \$9,793,254,202.00 desmbolsados por el MVCT, solo se ha pagado \$ 5,065.681.433.32							

Cuadro de seguimiento No.14, convenio No.1126. Elaboración propia OCI


Para el proyecto correspondiente a la comunidad Panchomana (Convenio 1126 de 2020), se evidencia que, según el informe de supervisión con corte a julio de 2025, la vigencia de ejecución del convenio fue programada inicialmente para un plazo de 18 meses, con fecha de inicio el 12 de noviembre de 2021.

Sin embargo, la fecha de terminación real actualmente proyectada es el 11 de mayo de 2026, de acuerdo con lo establecido en los Otrosí No. 3 del 9 de mayo

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

de 2025, lo cual representa un retraso de tres (3) años frente al cronograma originalmente definido.


Capturas de pantalla, soporte a las observaciones 1 y 2, incluidas en el cuadro de seguimiento No.14, convenio No.1126. Elaboración propia OCI:

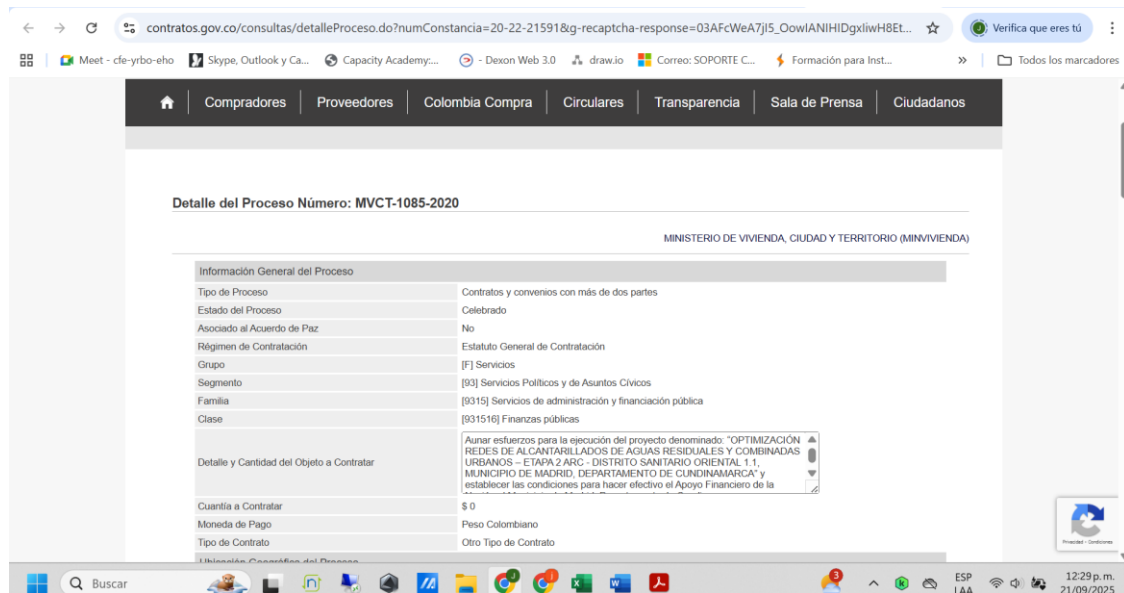

The screenshot shows the 'Detalle del Proceso' page for MVCT-1085-2020 on the Contratos.gov.co portal. The page is titled 'Detalle del Proceso Número: MVCT-1085-2020' and is under the 'MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (MINVIVIENDA)'. It displays a table with the following information:

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Contratos y convenios con más de dos partes
Estado del Proceso	Celebrado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[03] Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos
Familia	[0315] Servicios de administración y financiación pública
Clase	[031516] Finanzas públicas
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: "OPTIMIZACIÓN REDES DE ALICANTARILLADOS DE AGUAS RESIDUALES Y COMBINADAS URBANOS - ETAPA 2 ARC - DISTRITO SANITARIO ORIENTAL 1.1, MUNICIPIO DE MADRID, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la
Cuántia a Contratar	\$ 0
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Otro Tipo de Contrato

Soporte No.1 convenio No.1126. Captura de pantalla Secop I

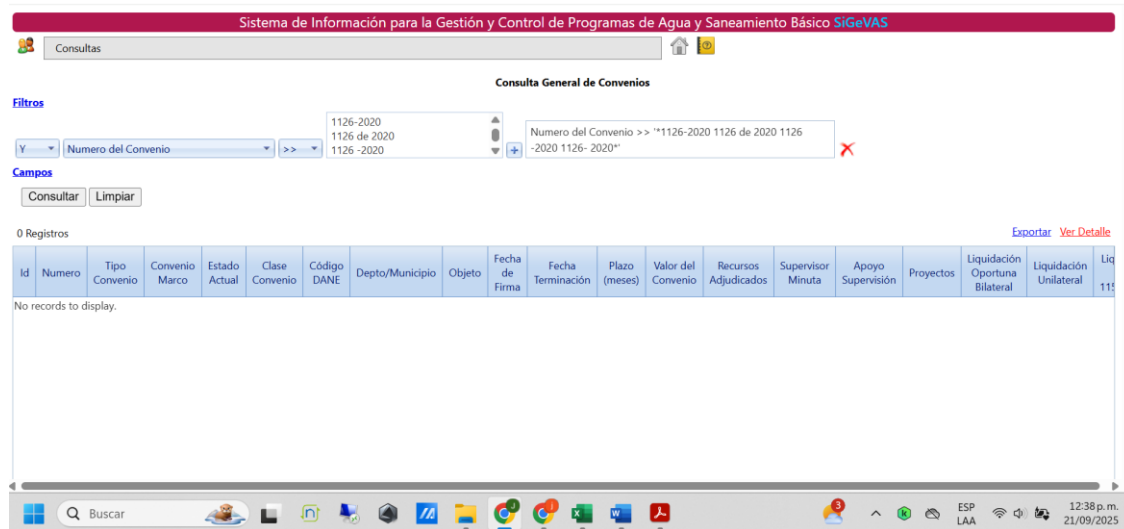

The screenshot shows the 'Consulta General de Convenios' interface in the SiGeVAS system. The interface includes a search bar with filters and a table of results. The search criteria are set to 'Numero del Convenio' with the value '1126-2020'. The table has the following columns: Id, Numero, Tipo Convenio, Convenio Marco, Estado Actual, Clase Convenio, Código DANE, Depto/Municipio, Objeto, Fecha de Firma, Fecha Terminación, Plazo (meses), Valor del Convenio, Recursos Adjudicados, Supervisor Minuta, Apoyo Supervisión, Proyectos, Liquidación Oportuna Bilateral, Liquidación Unilateral, and Liq. The table is currently empty, displaying 'No records to display.'

Soporte No.2 convenio No.1126. Captura de pantalla Secop I.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Convenio interadministrativo No. 1143 de 2021.

Nº Contrato/convenio		Convenio interadministrativo MVCT-1143-2021								
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		ESEPGUA S.A.E.S.P y Municipio Uribia		Tipo de proceso	CUR			
Objeto del contrato		Aunar esfuerzos para la ejecución de los proyectos denominados: "CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD DE POROPO, BAHIA HONDITA, GUAYABAL, SIAPANA, Y PUERTO VIRGEN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA" y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Uribia								
Fecha Acta de Inicio		12 de noviembre de 2021				Terminación Inicial		11 de abril de 2023		
Plazo inicial (meses)		17	Adición de tiempo (meses)		36	Total	53	Nueva fecha de terminación	11 de abril de 2026	
Resoluciones de Asignacion de Recursos 0573-0678-0679-0681-0680 de 2021			COP 36.871.629.861		Valor total reformulaciones Puerto Virgen, Siapana, Bahía Hondita, Guayabal, Poropo.		COP 11.461.821.860		Valor total del Convenio	COP 48.333.451.721
Modificaciones										
Nº	Fecha		Observaciones							
1	11 de abril de 2023		Otrosí No. 1 Prorrogar el plazo de ejecución por un (1) año, hasta el 11 abr de 2024							
2	10 de abril de 2024		Otrosí No. 2 Prorrogar el plazo de ejecución por dos (2) años, hasta 11 abr de 2026							
3										
4										
5										
6										
Resolución de Asignación de Recursos No. 0573 de 2021, No. 0678 de 2021, No. 0679 de 2021, No. 0680 de 2021, No. 0681 de 2021, No. 0646 de 2023 No. Certificado Disponibilidad Presupuestal 154721-\$4.773.180.571, 154421-\$95.463.611, 171623-\$2.354.304.823, 171723-\$47.086.096, 171623-\$2.354.304.823, 155221-\$7.587.709.923, 171823, 155021-\$9.044.256.253, 150024, 155424, 155121-\$6.489.636.391, 150424, 154921- \$8.253.873.589, 150824, 154621- \$129.792.728, 154821-\$151.754.198, 206621-\$180.885.125, 206521- \$165.077.472										
Fecha		Valor unitario desembolso			Orden de pago/bancaria		Publicado en el Secop			
1	21 de julio de 2022	COP 2.276.312.976			Pago No. 1		Siapana, Según informe se de Supervisión 31 Julio de 2025			
2	Fecha desconocida	COP 5.311.396.947			Pago No. 2		Siapana, Según informe se de Supervisión 31 Julio de 2025			
3	21 de julio de 2022	COP 1.431.932.571			Pago No. 1		Bahía Hondita, Según informe se de Supervisión 30 Julio de 2025			
4	Sin fecha	COP 3.341.248.000			Pago No. 2		Bahía Hondita, Según informe se de Supervisión 30 Julio de 2025			
5	21 de julio de 2022	COP 2.713.276.875			Pago No. 1		Poropo, Según informe se de Supervisión 31 Julio de 2025			
6	Sin fecha	COP 6.330.979.378			Pago No. 2		Poropo, Según informe se de Supervisión 31 Julio de 2025			
7	21 de julio de 2022	COP 1.946.890.917			Pago No. 1		Puerto Virgen, Según informe se de Supervisión 31 Julio de 2025			
8	7 de diciembre de 2022	COP 4.542.745.474			Pago No. 2		Puerto Virgen, Según informe se de Supervisión 31 Julio de 2025			
9	21 de julio de 2022	COP 2.476.162.076			Pago No. 1		Guayabal, Según informe se de Supervisión 30 Julio de 2025			
10	Sin fecha	COP 5.777.396.947			Pago No. 2		Guayabal, Según informe se de Supervisión 30 Julio de 2025			
11										
Valor Total desembolso MVCT, comunidades Siapana y Bahía Hondita.		COP 12.360.890.494,00			25,57%		Valor recurso pendiente por desembolsar, comunidades Siapana y Bahía Hondita			COP 4.633.072.602
Avance porcentual del Convenio		En el componente de Infraestructura se presenta un avance Siapana 83%, Bahía Hondita 80%, Poropo 5%, Puerto Virgen de 7%, Guayabal 5%.								
Observaciones:										
1. En la revisión realizada a la documentación publicada en la página del Secop I, se encuentra incompleta, evidenciando sólo el convenio, memorando 2021E0008218, otrosíes e informes de supervisión a fecha 29 feb de 2024. No hay informes de Supervisión del Municipio, oficio de delegación de la supervisión, entre otros documentos relevantes.										
2. En la revisión del SiGeVAS no se encontraron, estudios técnicos, informes de consultorías, informes de Interventoría, soporte de pagos, presupuesto, especificaciones, informes de laboratorios, entre otros documentos que hacen parte del Convenio y que deberían estar publicados en el aplicativo.										
3. No se evidencia informes de Interventoría a los contratos de obra derivados del convenio.										
4. No se encontró información de los diagnósticos, intervenciones y otros costos directos , como también presupuestos, informes de consultoría o información que permita determinar el costo para cada proyecto.										
5. La información suministrada en el cuadro de excel, requerimiento OCI seguimiento sentencia T-302 de 2017, enviada mediante oficio con radicado 2025IE0009010 no coincide con los soportes revisados, puntualmente con el valor del convenio.										
6.Es importante aclarar que según informe de supervisión con fecha 30 julio de 2025, para Puerto Virgen de los \$6,489,636,391.00 desembolsados por el MVCT, solo se ha pagado \$994,979,065.36										
7.Es importante aclarar que según informe de supervisión con fecha 30 julio de 2025, para Siapana de los \$7,587,709,923.00 desembolsados por el MVCT, solo se ha pagado \$2,518,063,345.32										
8.Es importante aclarar que según informe de supervisión con fecha 30 julio de 2025, para Bahía Hondita de los \$ 4,773,180,571.00 desembolsados por el MVCT, solo se ha pagado \$ 2,370,913,983.53										
9.Es importante aclarar que según informe de supervisión con fecha 30 julio de 2025, para Guayabal de los \$ 8,253,873,589.00 desembolsados por el MVCT, solo se ha pagado \$290,696,823.99										
10.Es importante aclarar que según informe de supervisión con fecha 30 julio de 2025, para Poropo de los \$9,044,256,253.00 desembolsados por el MVCT, solo se ha pagado \$655,259,800.67										
11. No se evidenció acta de reunión o informe de comisión de la última inspección realizada in sitio por el MVCT										
12. En el informe de supervisión, Siapana municipio de Uribia con fecha 31/07/2025, el valor total de los proyectos reportados es de \$41.257.484.654. No coincide con el resto de los otros cuatro proyectos con valor total del convenio por \$ 48.333.451.721										

Cuadro de seguimiento No.15, convenio No.1143. Elaboración propia OCI

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Para los proyectos correspondientes a las comunidades Bahía Hondita y Siapana (Convenio 1143 de 2021), se establece que, según el informe de supervisión con corte a julio de 2025, la vigencia de ejecución del convenio fue programada inicialmente para un plazo de 17 meses, con fecha de inicio el 12 de noviembre de 2021.

No obstante, la fecha de terminación real actualmente proyectada es el 11 de abril de 2026, conforme a lo dispuesto en el Otrosí No. 2 del 10 de abril de 2025, lo cual representa un retraso de aproximadamente tres (3) años frente al cronograma originalmente definido.

Cabe señalar que, aunque los proyectos correspondientes a las comunidades Poporo, Puerto Virgen y Guayabal no hacen parte de las comunidades beneficiarias directas de esta acción, al estar incluidos dentro del mismo convenio se observa una baja ejecución, la permanencia de recursos desembolsados sin ejecutar y un presunto incumplimiento contractual, lo cual amerita seguimiento por parte de las instancias competentes.

Para la Acción No. 5, con base en la información consolidada en los cuadros de seguimiento, se identificó que el valor desembolsado por el MVCT asciende a \$ 63.707.108.085.

3. Acción No. 6 *Capacitación de las comunidades en materia de potabilización y almacenamiento del agua, y asistencia técnica a los esquemas asociativos o de gestión encargados de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua.*

Del análisis de la información registrada en el aplicativo Sinergia V2 del DNP, correspondiente a la meta de capacitaciones, se observaron las siguientes situaciones:

- La meta específica asignada por el MVCT, para el periodo comprendido entre 2022 hasta 2026 fue de 1184 capacitaciones.
- El valor total de inversión asociado al MVCT reportado en la plataforma asciende a \$760.000.000.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Ahora bien, al revisar los reportes trimestrales desde abril-junio de 2024, se identificaron las siguientes inconsistencias:

1. Se evidencian inconsistencias entre los avances trimestrales registrados y los avances trimestrales reportados, lo cual genera dificultad para establecer la trazabilidad real de las capacitaciones ejecutadas. Un ejemplo de ello se presenta en el segundo trimestre de 2024, donde en el apartado de *principales avances* se reportan 228 capacitaciones para dicho periodo, mientras que en el registro de avances se consigna un total de 422, cifra que corresponde al acumulado anual y no al trimestre señalado.

Respecto al avance físico indicado:

- El sistema reporta un avance de 150,34 %, equivalente a 1780 de 1184 capacitaciones programadas. Para el cierre de la vigencia de 2024, la meta total proyectada hasta el 2026 ya fue cumplida.

En relación con la ejecución financiera, se analizaron las dos fuentes disponibles: el archivo en Excel remitido a la OCI y la información registrada en la plataforma Sinergia V2.0.

En el archivo en Excel, la ejecución financiera reportada corresponde al desarrollo de las actividades asociadas a los componentes de aseguramiento, gestión social y técnico de los proyectos diferenciales para el abastecimiento de agua potable bajo el esquema de pilas públicas, financiados con recursos de la Nación (PGN), a través de prestaciones de servicios.

Por su parte, en Sinergia V2.0 la ejecución presupuestal registrada para esta actividad es de cero por ciento (0 %).

A partir de lo anterior, se puede concluir que no existen recursos imputados de manera independiente a esta actividad, debido a que su financiación se encuentra integrada dentro del componente de aseguramiento, lo que impide identificarla como una línea presupuestal específica.

A continuación, se relaciona el cuadro de seguimiento para esta actividad:

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Capacitaciones

Nº Contrato/convenio	Números de contratos desconocidos						
Suscritos	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio				Tipo de proceso	Prestación de servicios	
Objeto del contrato	Implementación "Estrategia de aseguramiento y social para la gestión comunitaria del agua y saneamiento básico y la promoción de mecanismos para la sostenibilidad de las soluciones sectoriales que se implementen en La Guajira"						
Fecha de Inicio	1 de febrero de 2024				Terminación Inicial	Meta cumplida Diciembre 2024	
Plazo inicial (meses)	11	Adición de tiempo (meses)		Total	11	Nueva fecha de terminación	
Valor total de todos los proyectos del convenio	COP 760.000.000		Valor total proyecto			Valor total del Convenio	COP 760.000.000
Modificaciones							
Nº	Fecha	Observaciones					
1							
2							
3							
4							
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal desconocido							
Fecha		Valor unitario desembolso	Orden de pago/bancaria	Publicado en el Secop			
1							
2							
3							
4							
Valor Total desembolso MVCT		COP 0,00	0,00%	Valores recursos no ejecutados			
Avance porcentual del Convenio		Se presenta un avance 100% cumplido.					
Observaciones: 1. Una vez revisada la información compartida en el Drive, suministrado mediante oficio con radicado 2025IE0009010, no se encontró información de la parte precontractual, contractual y postcontractual, como acta de inicio, contrato, informes de supervisión, acta de liquidación, soportes financieros, informe final entre otros documentos de los contratos de prestación de servicios. 2. En la información revisada se evidenció los soportes de las capacitaciones, como también archivos que no hacen parte del proyecto y algunos pdf dañados. 3. Respecto a la información suministrada en el Drive, no se evidencia un orden coherente con respecto a la nomenclatura de los archivos almacenados.							

Cuadro de seguimiento No.16, Capacitaciones. Elaboración propia OCI

Para la ejecución de las capacitaciones contempladas en la acción No. 6, se identificó un valor ejecutado de \$760.000.000, correspondiente a actividades asociadas a los componentes de aseguramiento, gestión social y técnico de los proyectos diferenciales para el abastecimiento de agua potable bajo el esquema de pilas públicas, financiados con recursos de la Nación (PGN).

No obstante, no se encontró evidencia de la relación de los contratos de prestación de servicios mediante los cuales fueron asignados dichos recursos, ni se dispone de un informe final que permita verificar el cumplimiento de las metas establecidas para esta acción.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

4. Acción No. 12 Nuevas soluciones de acceso a agua para las comunidades que no cuentan con infraestructura.

Del análisis de la información registrada en el aplicativo Sinergia V2 del DNP, correspondiente a la meta de nuevas soluciones de acceso al agua para comunidades sin infraestructura a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), se observaron las siguientes situaciones:

- La meta registrada con corte al 31 de diciembre de 2024 corresponde a siete (7) nuevas soluciones en el municipio de **Manaure**.
- El valor total de inversión asociado al MVCT reportado en la plataforma asciende a \$20.200.000.000.
- Al revisar el último reporte trimestral de 2024, se identificó que dichas siete soluciones están asociadas al Convenio No. 004 de 2021.
- Solo se dispone de información hasta el último trimestre de 2024, sin actualización para la vigencia 2025.

En relación con el avance físico indicado, el sistema reporta un 23,33 % de cumplimiento, equivalente a 7 de las 30 nuevas soluciones establecidas como meta.

Por otra parte, de acuerdo con la información remitida a la Oficina de Control Interno (OCI) mediante el memorando 2025IE0009010, el archivo de seguimiento en Excel reporta la misma cantidad total de soluciones (30), pero discriminadas de la siguiente manera:

- Alcaldía de Uribia: 26 nuevas soluciones.
- Alcaldía de Manaure: 2 nuevas soluciones.
- Alcaldía de Maicao: 1 nueva solución.
- Distrito de Riohacha: 1 nueva solución.

No obstante, en el archivo de seguimiento (excel) solo se identifican dos convenios vigentes:

- Convenio No. 1190 de 2023, suscrito con el municipio de **Uribia**.
- Convenio No. 1036 de 2022, suscrito con el municipio de **Maicao**, el cual se encuentra pendiente por contratación.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

En cuanto al Convenio No. 1190 de 2023, no se especifica el número de nuevas soluciones entregadas dentro de las 30 contempladas en la meta establecida para el periodo 2022–2026.

Respecto a la ejecución financiera, y tomando como base las dos fuentes analizadas (Sinergia V2 y archivo Excel remitido a la OCI), solo en este último documento se reporta un valor desembolsado de \$2.406.558.511,20, correspondiente al Convenio No. 1190 de 2023. Finalmente, para el municipio de **Riohacha**, no se encontró información financiera reportada en ninguna de las fuentes revisadas.

La presente acción contempla un total de dos (2) convenios, distribuidas de la siguiente manera: convenio interadministrativo No. 1390 de 2021 y convenio interadministrativo No. 1036 de 2022.

A continuación, se relaciona el cuadro de seguimiento para esta actividad:

Convenio de Uso de Recursos No. 1390 de 2023.

Nº Contrato/convenio		Convenio de uso de Recursos 1390 de 2023							
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		ESEPGUA S.A E.S.P y Municipio Uribia		Tipo de proceso	CUR		
Objeto del contrato		En virtud del presente convenio, las partes establecerán las condiciones para el manejo y ejecución de los recursos de apoyo financiero de la nación al municipio de Uribia, departamento de La Guajira en calidad de beneficiario, conforme con el acto administrativo de designación de recursos, a fin de realizar el proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PUBLICAS EN FLOR DEL PARAISO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA - LA GUAJIRA".							
Fecha Acta de Inicio		18 de julio de 2023				Terminación Inicial		17 de febrero de 2025	
Plazo inicial (meses)		19	Adición de tiempo (meses)		12	Total	31	Nueva fecha de terminación	17 de febrero de 2026
Valor total de todos los proyectos del convenio		COP 8.182.298.938		Valor total Adicional			Valor total del Convenio		COP 8.182.298.938
Modificaciones									
Nº	Fecha		Observaciones						
1	17 de febrero de 2025		Otrosl No. 1 Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta 17 feb de 2026						
2									
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal 159623, 159723									
Fecha		Valor unitario desembolso		Orden de pago/bancaria		Publicado en el Secop			
1	19 de marzo de 2024		COP 2.406.558.511,20		Desembolso No. 1		Información no publicada en el Secop I. Información suministrada en el Drive, enviado mediante oficio a la OCI con radicado 2025IE0009010		
2									
3									
4									
Valor Total desembolso MVCT		COP 2.406.558.511,20		29,41%		Valores recursos no ejecutados		COP 5.775.740.427	
Avance porcentual del Convenio		En el componente de Infraestructura se presenta un avance 46,66% que corresponde a Flor del Pariso, zona rural del minicipio de Uribia, relacionados en el informe de supervisión con corte a 31 julio de 2025.							
Observaciones:									
1. En la revisión realizada a la documentación publicada en la pagina del Secop I se encuentra incompleta evidenciando sólo el convenio, memorando, resolución de asignación de recursos y los otroslos. No hay informes de Supervisión del MVCT y del Municipio, oficio de delegación de la supervisión, entre otros documentos relevantes.									
2.En la revisión del SiGeVAS no arrojo ningun resultado en la busqueda =1390-2021									
3. No se evidencia informes de Interventoría a los contratos de obra derivados del convenio.									
4. No se encontró información de los diagnósticos, intervenciones y otros costos directos , como también presupuestos, informes de consultoría o información que permita determinar el costo para cada proyecto.									
5. La información suministrada en el cuadro de excel, requerimiento OCI seguimiento sentencia T-302 de 2017, enviada mediante oficio con radicado 2025IE0009010 no coincide con los soportes revisados, puntualmente con el valor del convenio, \$8.012.925,40									

Cuadro de seguimiento No.17, convenio No.1390. Elaboración propia OCI

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

De acuerdo con el informe de supervisión con corte a julio de 2025, se evidencia que la vigencia de ejecución del Convenio No. 1390 de 2023, correspondiente al proyecto para la comunidad Flor del Paraíso, fue inicialmente programada por un periodo de diecinueve (19) meses, con fecha de inicio el 18 de julio de 2023.

No obstante, la fecha de terminación real proyectada actualmente corresponde al 17 de febrero de 2026, según lo establecido en el Otrosí No. 1 del 17 de febrero de 2025, lo que representa un retraso aproximado de un (1) año respecto al cronograma inicialmente definido.

Adicionalmente, en el mismo informe de supervisión se registra la aprobación de la Reformulación No. 1 del proyecto, la cual puede ajustar los términos y condiciones nuevamente de su ejecución.

Convenio de Uso de Recursos No. 1036 de 2022.

Nº Contrato/convenio		Convenio de uso de Recursos 1036 de 2022						
Suscritos		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		ENEL COLOMBIA S.A.E.S.P.		Tipo de proceso	Mecanismo de obras por impuestos	
Objeto del contrato		"DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LOS TERRITORIOS ANCESTRALES DE JAIPACHON - UURACHA UBICADOS EN LA ZONA FRONTERIZA DEL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA. MAICAO"						
Fecha Acta de Inicio		19 de abril de 2023				Terminación Inicial		
Plazo inicial (meses)		20	Adición de tiempo (meses)		Total	20	Nueva fecha de terminación	18/08//2026
Valor total de todos los proyectos del convenio		COP 6.620.818.882		Valor total Adicional		Valor total del Convenio		COP 6.620.818.882
Modificaciones								
Nº	Fecha	Observaciones						
1								
3								
4								
5								
6								
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal 289323 fecha 23 junio 2023 159623 fecha 6 junio 2023								
Fecha		Valor unitario desembolso		Orden de pago/bancaria		Publicado en el Secop		
1								
2								
Valor Total desembolso MVCT		COP 0,00		0,00%		Valores recursos no ejecutados		
Avance porcentual del Convenio		En el componente de Infraestructura se presenta un avance 0%						
Observaciones:								
1. Pendiente contratar la Interventoria por Minvivienda, documentos enviados de DIDE-SDP a la oficina de contratos.								
2.No se encontro el link del Secop I ó Secop II. En el Sigevas sólo se encontro copia del convenio 1036-2022 firmado 24 oct de 2022. En el Drive suministrado mediante oficio con radicado 2025IE0009010 no se evidencio carpeta para el convenio 1036.								
3. No se encontró documentación para hacer el seguimiento del estado del convenio, como lo son, informes de supervisión, desembolso realizados, informes de interventoria, acta de inicio, modificaciones del convenio, resolucio								

Cuadro de seguimiento No.17, convenio No.1036. Elaboración propia OCI

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

El Convenio No. 1036 de 2022, suscrito el 24 de octubre de 2022 y con fecha de inicio del 19 de abril de 2023, cuenta únicamente con el contrato de obra adjudicado, sin que al corte del segundo semestre de 2025 se haya suscrito el contrato de interventoría. En consecuencia, no se evidencia información sobre la ejecución del convenio en los territorios ancestrales Jaipachon - Urraicha, ubicados en el municipio de Maicao.

Inicialmente, la ejecución fue programada por un periodo de veinte (20) meses, con fecha de terminación prevista para el 18 de diciembre de 2024. Sin embargo, la fecha de terminación real actualmente proyectada corresponde al 18 de agosto de 2026, lo que representa un retraso aproximado de casi dos (2) años respecto al cronograma original.

Adicionalmente, persiste la incertidumbre sobre dicha proyección, dado que la fecha podría modificarse hasta tanto no se inicie efectivamente la obra. Esta situación podría generar eventuales reclamaciones o demandas por parte del contratista de obra, debido a la ausencia de interventoría, indispensable para garantizar el cumplimiento y la calidad de su contrato.

Avances reportados desde el último informe de seguimiento OCI.

Acción No. 1.

Al comparar la información del último informe de seguimiento elaborado por la Oficina de Control Interno (OCI), correspondiente al segundo semestre de 2023 y primero de 2024, se reporta una ejecución financiera del 50%.

Sin embargo, considerando que para esta acción se presentó un incremento presupuestal, pasando de \$100.152.958.427 (según el último informe de la OCI) a \$150.758.000.000 (presente informe), la ejecución financiera actual se estima en aproximadamente el 35%, de acuerdo con los datos reportados a la OCI en el archivo "Requerimiento OCI – Seguimiento Sentencia T-302 de 2017", remitido mediante el memorando No. 2025IE0009010.

Seguimiento al Avance Financiero de Convenios y Contratos

En el marco del presente seguimiento, se realizó una revisión comparativa del avance financiero de los convenios y contratos frente a lo reportado en el informe anterior de la Oficina de Control Interno (OCI). A continuación, se detallan los resultados obtenidos:

- **Convenio No. 1205 de 2023:** Se registra un avance financiero del **89%**, lo cual representa un incremento significativo frente al **52%** reportado en el informe anterior.
- **Convenio de Cooperación Internacional No. 1540 de 2023:** Presenta un avance financiero del **90%**, en comparación con el **43%** reportado previamente por la OCI.
- **Contrato de Obra No. 600 de 2024:** Registra un avance financiero del **39,14%**, frente al **0,02%** informado en el último reporte de la OCI.
- **Contrato de Obra No. 605 de 2024:** Muestra un avance financiero del **70,13%**, mientras que en el informe anterior se reportó un **20%**.
- **Contrato de Obra No. 608 de 2024:** Se encuentra en estado **terminado**, en concordancia con lo indicado en el informe anterior. Sin embargo, se desconoce el estado de su liquidación, información que no fue suministrada.
- **Contrato de Obra No. 615 de 2024:** Registra un avance financiero del **30,97%**, valor similar al **30%** informado en el seguimiento anterior.
- **Contrato de Obra No. 632 de 2024:** Presenta un avance financiero del **53,62%**, superior al **20%** reportado anteriormente.
- **Contrato de Obra No. 655 de 2024:** No fue incluido en este seguimiento, dado que no se encontraba relacionado en la información remitida a la OCI.
- **Contrato de Obra No. 656 de 2024:** Registra un avance financiero del **82,74%**, frente al **20%** consignado en el informe anterior.
- **Contrato de Obra No. 706 de 2024:** Muestra un avance financiero del **92,58%**, en comparación con el **20%** previamente informado.
- **Contrato de Obra No. 631 de 2024:** Presenta un avance financiero del **45,10%**, frente al **4,01%** reportado anteriormente.
- **Memorando de Entendimiento:** No fue posible realizar el seguimiento, ya que no se allegaron soportes ni documentación relacionada en la información enviada a la OCI. Por tanto, no es posible establecer ni comparar su avance financiero.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Por tratarse de información incorporada con posterioridad al análisis ya realizado en el aplicativo SINERGIA V2.0, es decir, después del 5 de octubre de 2025, el reporte correspondiente a esta acción para el primer trimestre de 2025 no fue incluido en el presente seguimiento.

No obstante, se evidencia que, para el mes de marzo de 2025, la acción registró un avance acumulado del 23,58%, según la información disponible en la plataforma.

Observaciones Generales.

1. En el seguimiento realizado, no se evidenció la existencia de documentos que respalden la sostenibilidad y operatividad de los proyectos. Entre los aspectos no documentados se encuentran: certificaciones de equipos y garantías, registros de mantenimientos preventivos y correctivos, información sobre la vida útil de los pozos de agua, medición del volumen de agua extraída, así como evidencia de la capacitación del personal técnico responsable.

La ausencia de esta documentación representa una debilidad que puede afectar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el marco de la Sentencia T-302 de 2017, relacionados con la garantía del acceso al agua en condiciones de disponibilidad, calidad y continuidad.

2. Se evidenció que la información precontractual, contractual y poscontractual de los proyectos, registrada en los aplicativos SIGEVAS, SECOP I y II, así como en OneDrive suministrado a la OCI, resulta insuficiente, lo que impide realizar una trazabilidad completa y adecuada de los proyectos. Particularmente, se identifican limitaciones para consultar y verificar el componente técnico, incluyendo los costos asociados y su discriminación detallada.
3. Respecto al acceso al Secop, se presentaron inconsistencias, como, por ejemplo, en el caso del CUR 1126 de 2021, el acceso suministrado corresponde erróneamente al contrato 1085 de 2020, lo que genera confusión y limita la verificación efectiva del objeto contractual relacionado.

Decreto 1082 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional). **Artículo 2.2.1.1.1.7.1** -

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Publicidad en el SECOP. *Este artículo establece que las entidades estatales están obligadas a publicar en el SECOP los documentos del proceso de contratación y los actos administrativos correspondientes, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.*

Ley 1712 de 2014. *Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. **Artículos 6 y 9:** Obliga a las entidades públicas a divulgar información relacionada con la contratación pública, incluidos contratos, ejecución y supervisión.*

Resolución 168 de 2021 – *Colombia Compra Eficiente. Regula el uso del SECOP II y refuerza la obligación de publicar los documentos del proceso para garantizar trazabilidad y control ciudadano.*

*Las entidades estatales están obligadas a publicar, entre otros, los siguientes documentos en SECOP (según la etapa): **Etapa precontractual:** Estudios previos, pliegos de condiciones, invitaciones públicas, cronogramas. **Etapa contractual:** Contrato suscrito, pólizas, actas de inicio, modificaciones (otrosíes), adiciones, prorrogas. **Etapa poscontractual:** Actas de liquidación, informes de supervisión, certificaciones de cumplimiento.*

4. No se evidencia información básica en lo que se refiere al componente técnico que permita dimensionar el alcance del proyecto y sus obras derivadas.
5. Para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2024 y primer semestre de 2025 se desconoce en la mayoría de los casos, informes de supervisión o soportes que puedan validar su gestión.
6. Para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025, no se presentan, en la mayoría de los casos, periodicidad en los informes de supervisión y/o soportes documentales de la misma, que permitan validar la gestión realizada durante dicho lapso.
7. En cuanto a la ejecución financiera para ninguno de los proyectos se evidencia publicación de los soportes tanto en el Secop I como en el Secop II.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

8. La ejecución financiera refleja un valor desembolsado mucho mayor al realmente pagado en las obras.
9. Respecto al uso de firmas electrónicas en el SECOP II para las modificaciones contractuales de contratos y convenios, en los otrosíes publicados, se verificó que no se evidencia documentación o trazabilidad que permita validar la autenticidad de dichas firmas electrónicas, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, reglamentado por el Decreto 2364 de 2012, y demás normas aplicables.
10. En la plataforma SECOP II, únicamente se observa que el estado de estos documentos aparece como “publicado”, sin que se pueda verificar si se han cumplido los requisitos legales que le otorgan validez jurídica a las firmas electrónicas utilizadas para formalizar dichas modificaciones.

RIESGOS Y CONTROLES IDENTIFICADOS

Como riesgos identificados y materializados al seguimiento realizado, se observó debilidad en cuanto a la supervisión de los proyectos, la falta de información publicada en los aplicativos Secop I-II y Sigevias, como también la carencia de información financiera. **MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA MVCT**, Versión: 2, Fecha: 23/06/2023, Código: GCT-M-02. **ACTIVIDADES GENERALES:** **c)** Realizar el seguimiento, verificación y control de la legalización, ejecución y cierre del contrato o convenio principal o marco, y de todos los contratos o convenios derivados que se llegaren a suscribir para la ejecución y cumplimiento de estos. **e)** Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato o convenio y de los cronogramas previstos en los mismos. **p)** Supervisar el contrato o convenio marco o principal y velar porque el contratista supervise de manera adecuada todos los derivados que se celebren para la ejecución del primero.

Como riesgo de corrupción identificado y que se recomienda que sea analizado para su inclusión en la matriz del proceso Gestión a la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico o de Gestión Contractual, es el relacionado con el proceso y asignación en el ámbito de la contratación directa, especialmente en lo relacionado con la asignación, justificación y seguimiento de estos procesos.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Algunas de las situaciones de riesgos que se presentan cuando se utiliza la contratación directa se relacionan con:

- Falta de pluralidad de oferentes o ausencia de competencia.
- **Presupuesto mal estimado** o sin soporte técnico.
- Ausencia de estudios previos o justificación formal para la modalidad directa.
- Garantías inadecuadas o no exigidas, lo que puede impedir que la entidad se proteja frente a incumplimientos.
- Discrecionalidad excesiva, lo que puede favorecer malos manejos o corrupción.
- *Riesgo de incumplimiento, demoras, sobrecostos, menor calidad del servicio o producto contratado.*

ACCIONES DE MEJORAMIENTO

A continuación, se presenta el listado de las acciones de mejora formuladas por la Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (VASB) dentro del Plan de Mejoramiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, orientadas a subsanar los hallazgos relacionados con el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.

Sin embargo, se evidenció que no se cuenta con reportes de avance parcial por parte de las áreas responsables, situación que impide verificar el cumplimiento progresivo de las acciones comprometidas, así como el cierre oportuno de los hallazgos identificados.

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

Informe	Hallazgo	Actividad	fecha de inicio	fecha de terminación
H13(2024) Auditoría Financiera MVCT, vigencia 2024	Suscripción del Contrato No. 656 de 2024. Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria y Penal. (A-D-P). Se observa que se seleccionó a una fundación para la ejecución de una obra cuando esta no está facultada para dicha actividad, así como también, se certificó al contratista cuando los documentos aportados no contaban con la rigidez legal exigida por la ley, lo que evidencia que presuntamente no se cuenta con la idoneidad y capacidad para el desarrollo del objeto contractual encomendado	Ajuste de formato de estudios previos para la contratación directa, incluyendo la justificación de la selección de la modalidad, la certificación de la capacidad y la experiencia que debe tener el contratista seleccionado	7/07/2025	31/12/2025
7AEFT302 Actuación Especial de Fiscalización sobre el seguimiento a las órdenes emitidas por la corte constitucional en la sentencia T-302 de 2017 y autos derivados en cumplimiento de las ISSAI de auditoría de cumplimiento	Ejecución de los contratos Nro. 600, 656, 706, 605, 615, 631, 632 y 706 de 2024. Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria Se identificaron atrasos en la ejecución de los cronogramas de actividades, de los contratos de obras suscritos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco de la declaratoria de emergencia (Decreto 1085 de 2023)	Establecer procedimiento que permita hacer el seguimiento efectivo de los contratos en su fase de ejecución.	24/02/2024	30/11/2025
8AEFT302 Actuación Especial de Fiscalización sobre el seguimiento a las órdenes emitidas por la corte constitucional en la sentencia T-302 de 2017 y autos derivados en cumplimiento de las ISSAI de auditoría de cumplimiento	Si bien la meta del contrato correspondía a ser un de carácter referencial y estimativo, el alcance final del contrato denota que el valor de referencia establecido por parte del MVCT para determinar el alcance inicial no guardo relación con la realidad, reduciendo la meta establecida un 32,25 %, limitando así el acceso al servicio de agua potable a 10 comunidades	Incluir la obligación de revisión periódica en el contrato desde el estudio previo hasta el clausulado	24/02/2024	30/11/2025

Cuadro No.18. Acciones de mejoramiento, sentencia T-302 de 2017 con corte a septiembre 30 de 2025, Elaboración propia OCI.

RELACION CON PAI Y PEI	APLICA	NO APLICA	X
------------------------	--------	-----------	---

RECOMENDACIONES

Se recomienda revisar las observaciones formuladas para cada uno de los proyectos en los cuadros de seguimiento, con el fin de compararlas y validarlas frente a la información disponible en el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Esta verificación permitirá identificar inconsistencias, confirmar el estado real de avance y fortalecer la trazabilidad de las acciones ejecutadas en el marco del cumplimiento de las metas establecidas.

Gestionar de manera inmediata, por parte de la Supervisión del MVCT, la liquidación de los contratos de obra ya finalizados, en cumplimiento de lo establecido en la normatividad contractual vigente. Esta actividad, además de constituir una obligación legal y administrativa, servirá como soporte e insumo de gestión frente a los Entes de Control, permitiendo evidenciar el cierre adecuado de los procesos contractuales y el uso eficiente de los recursos públicos.

Revisar los procesos de planeación, programación y posibles contingencias, necesarios para garantizar la terminación de la totalidad de las obras que hacen

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O DE LEY
PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA
Versión: 11.0 Fecha: 02/04/2025 Código: EIA - F-11

parte de las actividades para el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, departamento de la Guajira.

Reforzar el equipo de supervisión y así fortalecer el seguimiento a los contratos y convenios en los componentes técnicos, legales, administrativos, financieros y ambientales, de tal forma que la exigencia del cumplimiento de las obligaciones de Interventorías y Contratistas se materialice en obras de calidad y entregas oportunas.

PAPELES DE TRABAJO


Memorando 2025IE0009010 de 3 de septiembre de 2025, que contiene el enlace [Requerimiento OCI- Seguimiento ST- 302 de 2017.](#)

CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE AUDITORIA Y LIMITACIONES


Cabe resaltar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden presentarse algunos errores, imprecisiones o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados.

El MVCT y las áreas que lo componen, son responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para las 3 líneas de defensa. Asimismo, es responsabilidad de cada área la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad, de manera oportuna, completa, integra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

FIRMAS:



JOSÉ JORGE ROCA MARTÍNEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



ALEJANDRO CANO PEÑA
AUDITOR OCI
